

送付
目録
送付
送付

第176号 送付目録

公機密第二二〇號


昭和十三年二月二十三日

在滿洲國
特命全權大使 植田謙

外務大臣 廣田弘毅 殿

康徳四年七月分國都建設局業務概要月報
送付ノ件

國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報七月分日文第五十一報何等
御參考迄一部送付ス



在滿日本帝國大使館

(12. 11. 50,000 鮫川納)

第三課

手子
附
添
付

REEL No. A-0670

アジア歴史資料センター

本信照合票挿入先

A	門
2	類
2	項
0	目
L	號
✓	

公機密第二二〇號


昭和十三年二月二十三日

在滿洲國
特命全權大使 植田謙

外務大臣 廣田弘毅 殿

康德四年七月分國都建設局業務概要月報
送付ノ件

國務院國都建設局作成ニ係ル標記月報七月分日文第五十一報何等
御參考迄一部送付ス



第三課

手子
附
添
付

在滿日本帝國大使館

(12. 11. 50,000 鮎川納)

REEL No. A-0670

アジア歴史資料センター

秘

康德四年八月廿五日

77 21

七月廿五日
康德四年
國都建設局業務概要月報
(第三十一報)

秘

國務院國都建設局

REEL No. A-0670

0323

アジア歴史資料センター

自康德四年七月 一日
至康德四年七月三十一日

康德四年 國都建設局業務概要月報 (日 第五十一號 文)
七月分



國務院國都建設局

康德四年七月分國都建設局業務概要月報目次

第一章	人事關係	一
第二章	豫決算關係	五
第三章	用度關係	九
第四章	法規關係	一五
第五章	佈告並公告	一六
第六章	呈文	一七
第七章	國都建設事業紹介宣傳關係	一八
第八章	一般涉外關係	二一
第九章	土地關係	二六
第十章	土地買收及買收豫定區域圖	三六ノ次
	測量關係	三七
第十一章	買收土地測量工程圖	三八ノ次
	製圖關係	三九

第十二章	道路關係	四〇
	道路工事工程圖	四九ノ次
第十三章	上水道關係	五〇
第十四章	下水道關係	五七
	下水道工事工程圖	六一ノ次
第十五章	建築關係	六二
第十六章	公共施設關係	六六
第十七章	工事件名表	七五
附	協和會國都建設局分會事項	

以上

第一章 人事關係

(1) 政府組織法改正ニ伴フ人事異動ニ關スル件
 首題ノ件ニ付キ當局關係者ニ於テ七月一月附左記ノ通り夫レソレ異動
 發令アリタリ

記

國都建設局長 鄭 禹
 兼任郵政總局長兼簡任一等

國都建設局技術處長 近 藤 安 吉
 兼國都建設局總務處長

兼任産業部技正兼簡任一等 川 上 幹 夫

任國都建設局事務官兼薦任六等
 給十級俸派在總務處辦事

(2) 官吏調任ニ關スル件(其ノ一)

兼ニ割愛調任方依頼シ置キタル監察院屬官劉鵬齡、徐治身ノ二名ニ付
 一キ左ノ通り發令セリ



記

監察院屬官 劉 翹 齡
全 徐 治 身

任國都建設局屬官敘委任三等
給七級俸 派在總務處辦事

康徳四年七月一日

(3) 官吏調任ニ關スル件(其ノ二)

曩ニ割愛調任方依頼シ置キタル恩賞局事務官相川岩吉ニ關シ左ノ通り
發令アリタリ

記

恩賞局事務官 相 川 岩 吉

任國都建設局理事官敘薦任四等
給六級俸 派在總務處辦事

康徳四年七月一日

2

(4) 官吏調任ニ關スル件(其ノ三)

首題ノ件ニ關シ曩ニ外交部ヨリ當局理事官藤森圓郷ノ調任方依頼アリ
(六月分月報参照)、之レカ支障ナキ旨回答致シ置キタル處左記ノ通
リ發令ヲ見タリ

記

國都建設局理事官 藤 森 圓 郷

任駐劄日本國大使館二等秘書官
敘薦任四等給五級俸

康徳四年七月一日

3



總計	臨時備人	備人	臨時員	雇員	囑託	官吏(薦、委)	委任官		薦任官			各科別	簡任官				資格所屬		
							技士	屬官	技佐	技正	事務官		理事官	計	囑託	技正		處長	局長
23	7	10		2		4		8			1	滿日							
64	3	30		20		11		9			1	1	滿日						總務
17	12	5											滿日	1					計
28	7	5		6	1	4	2	1	1				滿日						電
18	2	5		10		1		1					滿日						土
81	2	4		18		7	2	2	2		2	1	滿日						地
58	21	20		12		5	4	3	1		1		滿日	1	1				小
118	12	39		44	1	22	4	12	4	3	2		滿日						計
26		18											滿日						土
77	12	37	1	21		6	4	1	1				滿日						木
28	8	20											滿日						水
55	6	21		18		8	6	3	1				滿日						道
2	1					1	1						滿日						建
10	1			5		4	2	2					滿日						築
56	17	38				1	1						滿日	6	4	1	1		小
142	21	58	1	44		18	12	4	1	1			滿日						計
114	38	58		12		6	1	4	3	1			滿日						合
260	33	97	1	88	1	40	16	12	5	1	4	2	滿日	7	5	1	1		日
382	374	71	1	100	1	46	17	16	5	1	5	2	滿日	8	5	1	1	1	計

國都建設局職員一覽表 (昭和四年七月卅一日現在)

第二章 豫決算關係

◎ 康徳四年度預算並ニ七月末決算額左ノ如シ

一、歳入ノ部

康徳四年度國都建設局特別會計歳入科目追加ノ件ハ四月十七日附國務院指令第七十一號ヲ以テ認可セラレタリ

科	目	預算額	七月末決算額
第一款 土地收入	第一項 土地出租收入	二、六九一、一二四圓	二、一七〇、三六一圓
	第二項 土地出賣收入	一、五八七、七五〇	一、四四六、五三三
第二款 自來水收入	第一項 自來水收入	二、五三三、三七四	二、〇二五、七〇七
	第二項 自來水收入	八二三、三八八	二、六一、四〇四
第三款 雜收入	第一項 輕便鐵道租金	八二二、三三八	二、六一、四〇四
	第二項 雜收入	一一七、三三五	八八、六八一
總計		六、〇〇〇	五、二三四、七七

科	目	預算額	七月末決算額
第一款 國都建設局	第一項 俸津	三、八一九、九六〇圓	一、七二、九一六、一三
	第二項 辦公費	一、三八五、二二〇	六、三八二、七七八
第二款 建設事業費	第一項 土地費	二、四三三、四七四〇〇	一、〇八〇、八八三、五
	第二項 街路橋梁費	四、一三七、〇三三〇〇	一、〇四〇、九一九、五五
總計		五、二三一、八四七	三、九八五、三六八、四〇

二、歳出ノ部

科	目	預算額	七月末決算額
第一款 國都建設局	第一項 俸津	三、八一九、九六〇圓	一、七二、九一六、一三
	第二項 辦公費	一、三八五、二二〇	六、三八二、七七八
第二款 建設事業費	第一項 土地費	二、四三三、四七四〇〇	一、〇八〇、八八三、五
	第二項 街路橋梁費	四、一三七、〇三三〇〇	一、〇四〇、九一九、五五
總計		五、二三一、八四七	三、九八五、三六八、四〇

總計	第四款 自來水事業 資金利息補給金		第五款 撥入國債整 理基金特別 會計		第六款 各項發還款		第七款 各項支出款		第八款 國庫準備金	
	第一項 自來水事業 資金利息補 費	第一項 撥入國債整 理基金特別 會計	第一項 各項發還款	第一項 各項支出款	第一項 各項發還款	第一項 各項支出款	第一項 各項發還款	第一項 各項支出款	第一項 各項發還款	第一項 各項支出款
一七五二八〇〇〇	一七五二八〇〇〇	三二〇〇〇〇〇	三二〇〇〇〇〇	三〇〇〇〇〇	三〇〇〇〇	二二四六五〇〇	二二四六五〇〇	五〇〇〇〇〇	二〇〇〇〇〇	三〇〇〇〇〇
一〇二、三六三、〇〇一	一〇二、三六三、〇〇一	一四八、一五〇、六八	一四八、一五〇、六八	二九、八九九、九四	二九、八九九、九四	九三、八九〇〇	九三、八九〇〇			
六二、三、七、八九〇〇〇	六二、三、七、八九〇〇〇	一、六一九、二二六〇七	一、六一九、二二六〇七							

第三款 自來水費		第四項 建設費		第五項 污水道費		第六項 公共施設費		第七項 工程用建築 物造營費		第八項 調查費		第九項 專業完成紀 念式典費	
第一項 俸津	第二項 辦公費	第三項 給水費	第四項 建設費	第一項 堤防築造費	第二項 汚水道費	第一項 公共施設費	第二項 工程用建築 物造營費	第一項 調查費	第二項 專業完成紀 念式典費	第一項 堤防築造費	第二項 汚水道費	第一項 公共施設費	第二項 工程用建築 物造營費
二、四三、四九七、七六	一、四二、〇五、四八	一、九七、五六一、〇〇	八五、九一九、五〇〇	六三、六〇〇、〇〇	四一、四四二、〇〇	一九七、六七、〇〇	八六、六五、〇〇	四、五五、六四、〇〇	一、四九、五六、五〇	一、〇〇〇、〇〇	六三、六〇〇、〇〇	四一、四四二、〇〇	一九七、六七、〇〇
一、四三、四九七、七六	一、四二、〇五、四八	一、九七、五六一、〇〇	八五、九一九、五〇〇	二、六四四、一六	七三、四八五、八三	九一、六九七、五八	四、五六、四六、九	一、七〇、四八、五五	二、五、六五、〇五	一、〇〇〇、〇〇	二、六四四、一六	四一、四四二、〇〇	一九七、六七、〇〇
四、二、四四、五六八	七〇、二、一二、六八												

第三章 用度關係

- 七月中ニ於ケル用度關係事項ノ主ナルモノ次ノ如シ
- (1) 康徳興業公司請負伊通河砂採取運搬契約完結ノ件
 曩ニ本月十日迄期限延期許可セル首題ノ件ハ期日迄ニ完了セリ
 - (2) 南嶺淨水場沈澄池其他擴張工事用伊通河砂採取運搬請負契約締結ニ關スル件
 首題ニ關シ左記ノ通り契約締結セリ

契約番號	件名	契約數量	代價	期限	請負人氏名
契一號	伊通河砂採取運搬	五四〇 ⁸ M	七九三 ¹⁰ 八〇	七月二十五日	谷 一 一

(3) 小河台石山石材採掘運搬請負更新契約締結ノ件
 大同二年四月當局對福昌公司並ニ當局對南滿鐵業株式會社トノ間ニ締結シタル首題契約ハ本年六月三十日限ニテ期間滿了セルヲ以テ康徳七年十二月三十一日迄更新契約ヲ締結セリ

(4) 七月中營養需品局へ依頼購入物品請求調次ノ如シ

需品局依頼物品請求調 七月分

經費

款	項	目	件數	金額	總額
國都建設局費	辦公費	廳費	12	835 ¹⁴ 62	
・	・	備品費	2	218	00
・	・	廳費	5	231	96
自來水費	・	備品費	1	2950	00
・	・	給水費	3	124	60
・	・	運費	23	4360	18
	經費計				

需品局依頼物品請求調

七月分

事業費

款	項	目	件数	金額	種
建設事業費	街路橋梁費	街路替	14	50,007	38
	汚水通替	汚水通費	3	14,876	57
	公共施設費	公園費	1	2,945	50
	調査費	調査費	2	59	64
自來水費	建設費	水通費	4	9,623	42
		自來水管費	1	2,000	20
事業費計			25	79,512	71
経事業費合計			48	83,872	89

(5) 本月中直接購入物品請求調左ノ如シ

直接購入物品請求調

七月分

経費

款	項	目	件数	金額	種
鋼鉄建設局費	辦公費	應品費	51	710	90
		備品費	3	162	31
自來水費	辦公費	應品費	12	539	67
		備品費	3	35	25
	給水費	應品費	5	45	55
		備品費	5	118	15
		運轉費	25	152	51

經費計		104	1,764	34
-----	--	-----	-------	----

直接物品購入請求調

七月分

事業費

款	項	目	件数	金額	冊
建設事業費	土地費	出賣土地費	7	201	24
	街路橋梁費	街路費	24	10,223	91
		機械器具費	16	526	35
	汚水道費	汚水道費	1	16	00
	公共施設費	公園費	14	356	79
		種苗圃費	2	17	50
		機械器具費	4	26	62

18

建設事業費	調査費	調査費	件数	金額	冊
	事業完成記念式典費	雑費	9	51	15
	自來水費	水源費	4	52	15
		自來水管費	6	8,607	11
		調査及測量費	2	1,209	64
		機械器具費	1		95
			3	285	00
事業費計			93	14,132	93
經營事業費合計			197	14,309	37
總計			245	22,696	26

19

第四章 法規關係
一、七月中ノ主ナル法規事項ナシ

15

第五章 佈告並公告

七月中ノ佈告並公告左ノ如シ

一、 佈告ノ部

七月中ノ佈告ナシ

二、 公告ノ部

(1) オートバイ一台拂下ニ關スル件（公告第十四號七月十日 指示場 掲載）

第三章用度關係参照

(2) 器具及被服類拂下ニ關スル件（公告第十五號 七月十日 指示場 掲載）

第三章用度關係参照

(3) 硫酸礬土空 以拂下ニ關スル件（公告第十六號 七月十日、指示場 掲載）

16

第三章 用度關係参照

第六章 呈 文

康徳四年七月中ニ於ケル呈文左ノ如シ

(1) 六月分印紙收納報告書呈出ノ件(國務總理大臣宛、呈文第四十三號、七月六日)

(2) 出張方依頼ノ件(國務總理大臣宛、外務局長經田、呈文第四十四號、七月二十日)

「事務引續並ニ式典用務關係ノ爲メ駐日本大使館二等秘書官、藤森國郷ヲ左記日程ニ據リ出張方御詮議相成度及申請
追テ御詮議ノ上ハ電報ニテ其旨御指令相願様致度

記

出差豫定 自康康徳四年 八月一日

至全 九月中旬

出差地名 新京(國都建設局)

(但シ打切旅費支給ノコト)

17

第七章 國都建設事業紹介宣傳關係

康徳四年七月中ニ於ケル國都建設事業紹介宣傳關係ノ主ケル事項左ノ如シ

(1) 情報事務連絡ニ關スル件

七月一日附國務院訓令第六一號「情報事務規程ニ關スル件」並七月二日附總務廳公函第三〇〇一號(總公函第一一號三一三)「情報責任者及情報連絡者指定ニ關スル件」ニ基キ當局ハ七月四日近藤技術處長兼總務處長ヲ情報責任者ニ、相川庶務科長ヲ情報連絡者ニ指定セル旨回答セリ

(2) 情報連絡者會議ニ出席ノ件

七月十四日附總弘第九二號六四一六ヲ以テ弘報處長ヨリ通達アリタル「情報連絡者會議開催ノ件」ニ基キ、七月十五日國務院第一會議室ニ於テ開催セラレタル首通會議ニ赤松屬官出席セルガ、爾後引續キ開催セラレタル同會議ニ赤松、粕谷屬官交互出席連絡ニ從事セリ。

18

(3) 天覽寫真製作ニ關スル件

來ル九月國都建設記念式典舉行サルルニ當リ天覽寫真供スヘキ國都建設ニ關スル各種寫真ヲ製作ヲ懸々本月下旬ヨリ着手セリ

(4) 視察團來應ニ關スル件

七月中ノ當屆來訪視察者ハ總計二七〇名ニシテ一般ニ領與セル「リフレット」ハ計五三〇部ナリ

(5) 國都建設記念切手圖案當選者發表ノ件

茲ニ國都建設記念式典準備委員會ニ於テ一般ニ募集セル首題圖案ニ關シテ左ノ通り七月二十日附公報ニ發表セラレタリ

「本會ニ於テ募集中ノ國都建設記念切手圖案ハ去ル六月十五日ヲ以テ締切り當選者ヲ左ノ通決定セリ

一等(其ノ一) 東京市日本橋區茅場町二丁目十二ノ一

石川 啓 佑

一等(其ノ二) 全

全

選外佳作(三名)

大連市長春台二〇

廣 松 正 滿

新京西四馬路一三

韓 柳 麗

新京中央通二三神戶ビル田

中 貞 一

康徳四年七月

國都建設記念式典準備委員會

第八章 一般沙外關係

七月中ニ於ケル一般沙外關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(1) 社會教化團體及宗教關係土地用途變更取扱ニ關スル件

首魁ニ關シ八月三日新京特別市長宛左ノ通牒ヲナセリ

「從來當局ニ於テ社會教化團體並ニ宗教關係ノ用地ニ對シテハ大同二年五月二十四日國務院指令第十七號ニ依リ一般公定賣却價格ノ二割五分減價格ヲ以テ提供處分セル次第ナルカ最近斯種土地ニ對シテハ現名義人ヲシテ義ノ世減額ヲ追納セシメタル上之カ許可ヲ與ヘルコトニ決定セリ就テハ本用地ニシテ既ニ利用計畫完成ノモノニ在リテハ直接署宛名義變更出願ノ向可有之ニ付キ之等願出ニ關シテハ當局經由其ノ承認アルモノニ限り受理方御取計ヒ煩度此段要用及通知

追テ前記用地トシテ處分済ノモノハ現在別紙ノ通りニ有之猶將來ニ於テ處分決定ノ場合ハ其ノ都度通知可致ニツキ御諒知有之度爲念申添フ

(2) 新京結核療養所敷地内地土物件撤去補償費ニ關スル件

昭和十二年六月八日附ヲ以テ南滿洲鐵道株式會社總裁ヨリ總務廳長宛

31

左ノ依頼アリタリ

新京結核療養所敷地無償借受ニ關スル件

在滿結核罹患者ノ高率ナルニ不利之カ療養機關トシテハ僅ニ大連ニ於ケル南滿洲保健院ヲ除キ外ニ殆ト見ルヘキモノナキ現狀ニ有之一般市民ノ保健並防疫上洵ニ急務ニスヘカラサル問題ナリト忠考被致候依テ今般弊社創立三十周年記念事業トシテ全滿主要都市中貴地及外四箇所ニ結核療養所ヲ設立致シ各地市民ノ保健並防疫ニ貢獻致度之カ開設後ハ汎ク一般市民ノ療養ニ供スルト共ニ一部療養病床ヲ準備シ聊カ市民ノ福祉方面ニ盡力致度

就テハ右療養所敷地(別圖参照)トシテ左記用地ノ無償貸與方特別ノ御詮議ヲ以テ御承認相願度此段得實意候也

尙附近地域(別添圖面参照)ハ療養所ノ風致保持上並將來ニ於ケル擴張豫定地トシテ保留方並同地上物件撤去手配方併セテ御詮議相成度候

記

一、無償借受依頼地

22

- (1) 位置 孟家屯驛南方約一杆田家油房附近
 (2) 面積 約六萬平方米 (別添圖面指示ノ通)

三 保留地

別添圖面参照 (圖面省略)

右移牒ニ對シ當局ハ七月五日滿鐵總裁宛左ノ通牒ヲ發セリ

「六月八日附地地三七第一〇號ノ三 (京事地經由三七第五七號) ヲ以テ總務長官宛御申越ニ係ル首越敷地内所在地上物件撤去手配方ノ件了承右ハ別紙調書ノ通り當該地内備置豫算額國幣四二八九圓六角整必要ニ付至急御交付相成様致度此段得貴意候也」 (別紙調書省略)

(3) 南嶺淨水場工專用材料運搬ニ關東軍用地域内道路利用方申請ニ關スル件

首越ニ關シ七月十三日關東軍經理部長宛左ノ依頼ヲナセリ

「陳者貴南嶺軍用地域ニ接スル南嶺淨水場構内ニ於テ今般沈澄池掘張工事ヲ施工スルコトト相成タル處之レニ要スル所要材料ノ運搬或ハ勞務員ノ交通等ハ凡テ貴軍用地域ノ一部道路ヲ通過スルノ已ムナ

キ狀態ニ有之候ニ就テハ別紙示圖所ノ通行御承認相成度此段御願申上候

追而本件ニ關シテハ現地木山部隊附北原大尉迄御願申上候候爲念

(4) 東京站用地交換ニ關スル件

首越ニ關シ七月一日吉林鐵道局長宛左ノ照會ヲナセリ

「首越ノ件ニ付キ豫テ貴局御提案ニ關シ本年四月當局公函第三七二號ノ(一) (建土第一〇四號ノ(一)) ヲ以テ回答ヲ兼ネ及御協議置タル次第モ有之候處右ハ當局專業上ノ都合モ有之大体貴我交換地内所在地上物件ハ來ル本年八月迄ニ相互移轉實行ノ事ニ進行致度ニ付至急何分ノ御意見御回報相煩度及照會候也」

(四月分月報第四十八號第八章(山)ノ項参照)

(5) 萬家嶺小礮石輸送用貨車配給ニ關シ御依頼ノ件

首越ノ件七月三十日、奉天鐵道總局長宛左ノ依頼照會ヲ發セリ

「陳者本年一月九日附國建公函第三二號ヲ以テ御依頼申上候道路建設用石材運賃特約割引方ニ關シテハ種々御配慮ヲ忝フシ奉深謝候陳

者國都建設第一期五ヶ年事業ハ概ネ順調ニ進捗シ然レ本年モテ豫定ノ通り段落ヲ告クル運ヒト相成來ル九月中旬盛大ナル其ノ完成記念祝賀ノ式典ヲ舉行致ス豫定ニテ目下幹線道路ノ竣工ヲ急キ居リ候ハ先般萬家嶺方面ヨリノ小鋪石類輸送用貨車不意ニテ(一日僅カ二車)工率進捗上多大ノ支障ヲ來シ居候ニ就テハ御案内中誠ニ恐縮ノ外無之候得共特別ノ御詮議ヲ以テ一日六車以上ノ貨車線方御高配被下度此段特ニ御依頼申上候也

追テ右小鋪石ハ一部軍用道路築造ニ充當スヘキモノモ有之候間此點御含ミノ上可然御配慮願上候

(6) 大同大街外二街々路照明灯全灯開灯方依頼ノ件
首越ノ件七月一日、兩洲電業株式會社新京支店長宛左ノ依頼廻添ヲナセリ
「大同大街、興安大路及豐榮路街路照明灯ハ一本二灯式ノ内現在片側一灯ヲミ點灯中ノ處七月一日ヨリ全灯開灯方及御依頼」

第九章 土地關係

七月中ニ於ケル土地關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ
一 土地買收並地上物件補償概況

- (1) 本月ハ既買收地域内殘地ノ買收ヲ履行セル外南嶺五里窪子(市街建設地)西腰截子及南大房身(西部車用豫定地)ノ補償ヲ履行シ更ニ刁家山(車射擊場用地)並蕭家窪子(植樹場用地)等ニ於ケル地上物件ノ移轉補償ヲ開始シ東京驛附近(東部輕工業並市街建設地)地上物件ノ實地調査ニ着手セリ
- (2) 本月中ニ於ケル土地買收面積ハ一二八公畝、此買收並補償支出額ハ二六、八八一圓ニシテ本年度豫算額ニ對シ其支出割合ハ累計約二一・八%強ヲ示セリ
- 以上買收並補償ノ實績ハ左表ノ如シ

康徳四年七月中用地買収並地上物件補償状況表

區別	區間	買収		費額		地上物件補償費		合計	
		地積	收銀	地積	圓額	地積	圓額	地積	圓額
北部輕工業用地	二道溝附近	17	242	733	18	84	00	817	18
西部市街造成並雜種地	上石虎溝附近	31	800	779	60	3785	10	4564	70
西部用用地	楊家店					15	00	15	00
南部市街造成並雜種地	南鎮五里堡子附近	79	505	4436	98	16354	66	20491	64
東部輕工業用地	後五里堡子附近					992	81	992	81
計		128	547	5649	76	21231	57	26881	33
自康徳四年一月至七月迄ノ合計		2388	094	89074	92	116131	25	205206	17
康徳三年十二月迄ノ合計		150945	239	5740730	89	2274341	07	8015071	96
開辦以來累計		1533333	333	5829805	81	2390472	32	8220278	13
驛站水道用地									

29

區別	區間	買収		費額		地上物件補償費		合計	
		地積	收銀	地積	圓額	地積	圓額	地積	圓額
本月分	支拂ナシ								
計		19011	055	193815	24	80710	94	274526	18
本月分	支拂ナシ								
計		6546	784	252010	27	86215	49	338225	76

28

徳康四年七月中買收並地物件補償内譯表

區別	所在地	買收費			地上物件補償費	合計			
		地積	銀額	圓					
北輕工	二道溝	1	866	102	63	24	00	126	63
・	三道溝	13	114	524	56			524	56
・	楊家慶子	1	304	45	64			45	64
・	孟家橋		958	60	35	60	00	120	35
西市	上石虎溝	31	800	779	60			779	60
南市	西八里堡子	73	975	4040	70			4040	70
・	隋家窩棚	5	530	96	28			96	28
・	南嶺五里堡					798	24	798	24
・	刁家山					7540	37	7540	37
・	黑嘴子					17	00	17	00
・	蕭家堡子					7999	05	7999	05

82

區別	所在地	買收費			地上物件補償費	合計			
		地積	銀額	圓					
西軍用地	楊家店				15	00	15	00	
西市	腰載子				2649	00	2649	00	
西市	西大房身				1051	10	1051	10	
・	魯家屯				85	00	85	00	
康輕工	後五里堡子				992	81	992	81	
	計	128	547	5649	76	21231	57	26881	33
	自康德四年一月至七月迄ノ合計	2388	094	89074	92	116131	25	205206	17
	自康德三年十二月迄ノ合計	150945	239	5740730	89	2274344	07	8015071	96
	開辦以來ノ累計	153333	333	5829805	81	2390472	32	8220278	13

80

地目	筆數	面積	積	價	額	摘要
住居地域	二、七七三	五、一六二、一九八	七三	一〇、〇四六、二九	二五	
商業地域	一、〇七九	七三、一〇三、六	八〇	四、三六四、四三八	八五	
工業地域	一四	一、二二〇、四九	四一	一三、一、二九五	八〇	
特種地域	八	三、〇八二、四九八	一〇	一七、七五九、二	一九	拉々地無線送信 及其他車用地
雜種地域	二	二、五九三、四〇	〇一	二、一、七八四	九六	環狀線道路用地 其他
無電台用地	二	三、五三三、七五三	五五	二〇、五、二二一	九二	
總計	三、八八〇	一、二、八九〇、八七六	六〇	一四、九四六、四六二	九七	

(9) 開局以來（自大同二年六月至康徳四年七月）土地賣却成績左表
ノ如シ（土地代金完納分ノミヲ計上ス）

地目	筆數	面積	積	價	額	備考
住居地域	五一九	五、三三八、四五九	三六	一、三七〇、〇八七	九四	
商業地域	八一	九七、九八八	三	六、三七九、一七	三七	
工業地域	二	二、九三〇、三	九六	三、一〇六、二	一〇	
特殊地域	一	七九二、九九九	九四	三八九、一七	六〇	楊家店車用地
計	六〇三	一、四五八、七五一	五七	二、〇七七、九八六	〇一	

(10) 康徳四年度（自一月至七月）土地賣却成績左表ノ如シ（土地代金完納分ノミヲ計上ス）

地目	筆數	面積	積	價	額
商業地域	一六	五、八二二、	四八	二、七八〇、五	四〇
住居地域	一〇二	一〇、九九九、二	〇〇	三、一七〇、八六	〇〇
工業地域	一	二、一三、四	〇〇	二、三、四六二	〇〇
計	一一九	一、三七九、四八	四八	三、六八三、五三	四〇

(1) 康徳四年七月中ノ土地賣却成績左ノ如シ

三土地買却概況

四 囑託登記並執照發給概況
(1) 囑託登記

年 度 別	大 同 元 年 度	全 二 年 度	康 德 元 年 度	全 二 年 度	全 三 年 度	全 四 年 自 一 月 至 七 月
面 積	一、八八四、八六五 M ²	二、九一六、一一四	六、一八〇、九九一	二、二三八、二一七	一、九八三、五八九五	五、九一二、〇八九
料 金	八〇	五〇	一九	九〇	三七	二七
料 金	三、七五八圓	四、二九四八	八、〇〇二	二、四二六九	一、四八四〇六	一、四四二九五
料 金	六二	六二	九七	七四	五一	三四

(2) 年度別土地貸付数左表ノ如シ

三 土地貸付概況

(1) 康徳四年七月中ノ新規貸付並更新貸付契約左表ノ如シ

區 分	件 数	面 積	料 金
農 業 用 地	六	二、二〇、七七九 M ²	二、九九七圓
農 耕 地	三	八八一、二二	二三八
同 仁 郷 宅 地	一三	二、八二九	一三二
一 時 使 用 地	四七	一、八四、六六四	二、六〇九
和 順 郷 宅 地	八九	六、一三〇、三	二、〇六五
計	一五八	五、五七、六九八	八、〇四三
			八七

種別	年度	
	康徳元年	康徳二年
執照	二四六件	四〇六件
商租執照	一八八	一四九七
計	四三四	一、九〇三
	康徳三年	康徳四年 自一月至七月
執照	四六五件	五〇一件
商租執照	三七二	二八
計	八三七	五二九
	計	三、七〇三

(4) 年度別執照被給付件数左表ノ如シ

- (イ) 執照 八〇件
- (ロ) 商租執照 一件
- 計 八一件

(3) 執照被給


執照被給事務ハ康徳元年三月ヨリ開始セルカ康徳四年七月中ノ被給件数左ノ如シ

種別	年度	
	康徳元年	康徳二年
保存登記	一三一	二六三一
商租權設定	四	九二
所有權移轉	五	五五八
原所有權移轉	五	三四五
計	一四五	三、六二六
	康徳三年	康徳四年 自一月至七月
保存登記	五一	二三三
商租權設定	一	〇
所有權移轉	二八五	二七一
原所有權移轉	六七	八
計	八六四	五一二
	計	三、五〇六

(2) 年度別登記件数左表ノ如シ

- (イ) 保存登記 一四件
- (ロ) 所有權移轉登記 三五件
- (ハ) 原所有權移轉登記 四件
- (ニ) 變更登記 三件
- 計 五六件

囑託登記事務ハ康徳元年十二月六日ヨリ開始セルカ康徳四年七月
中ノ囑託登記件数左ノ如シ

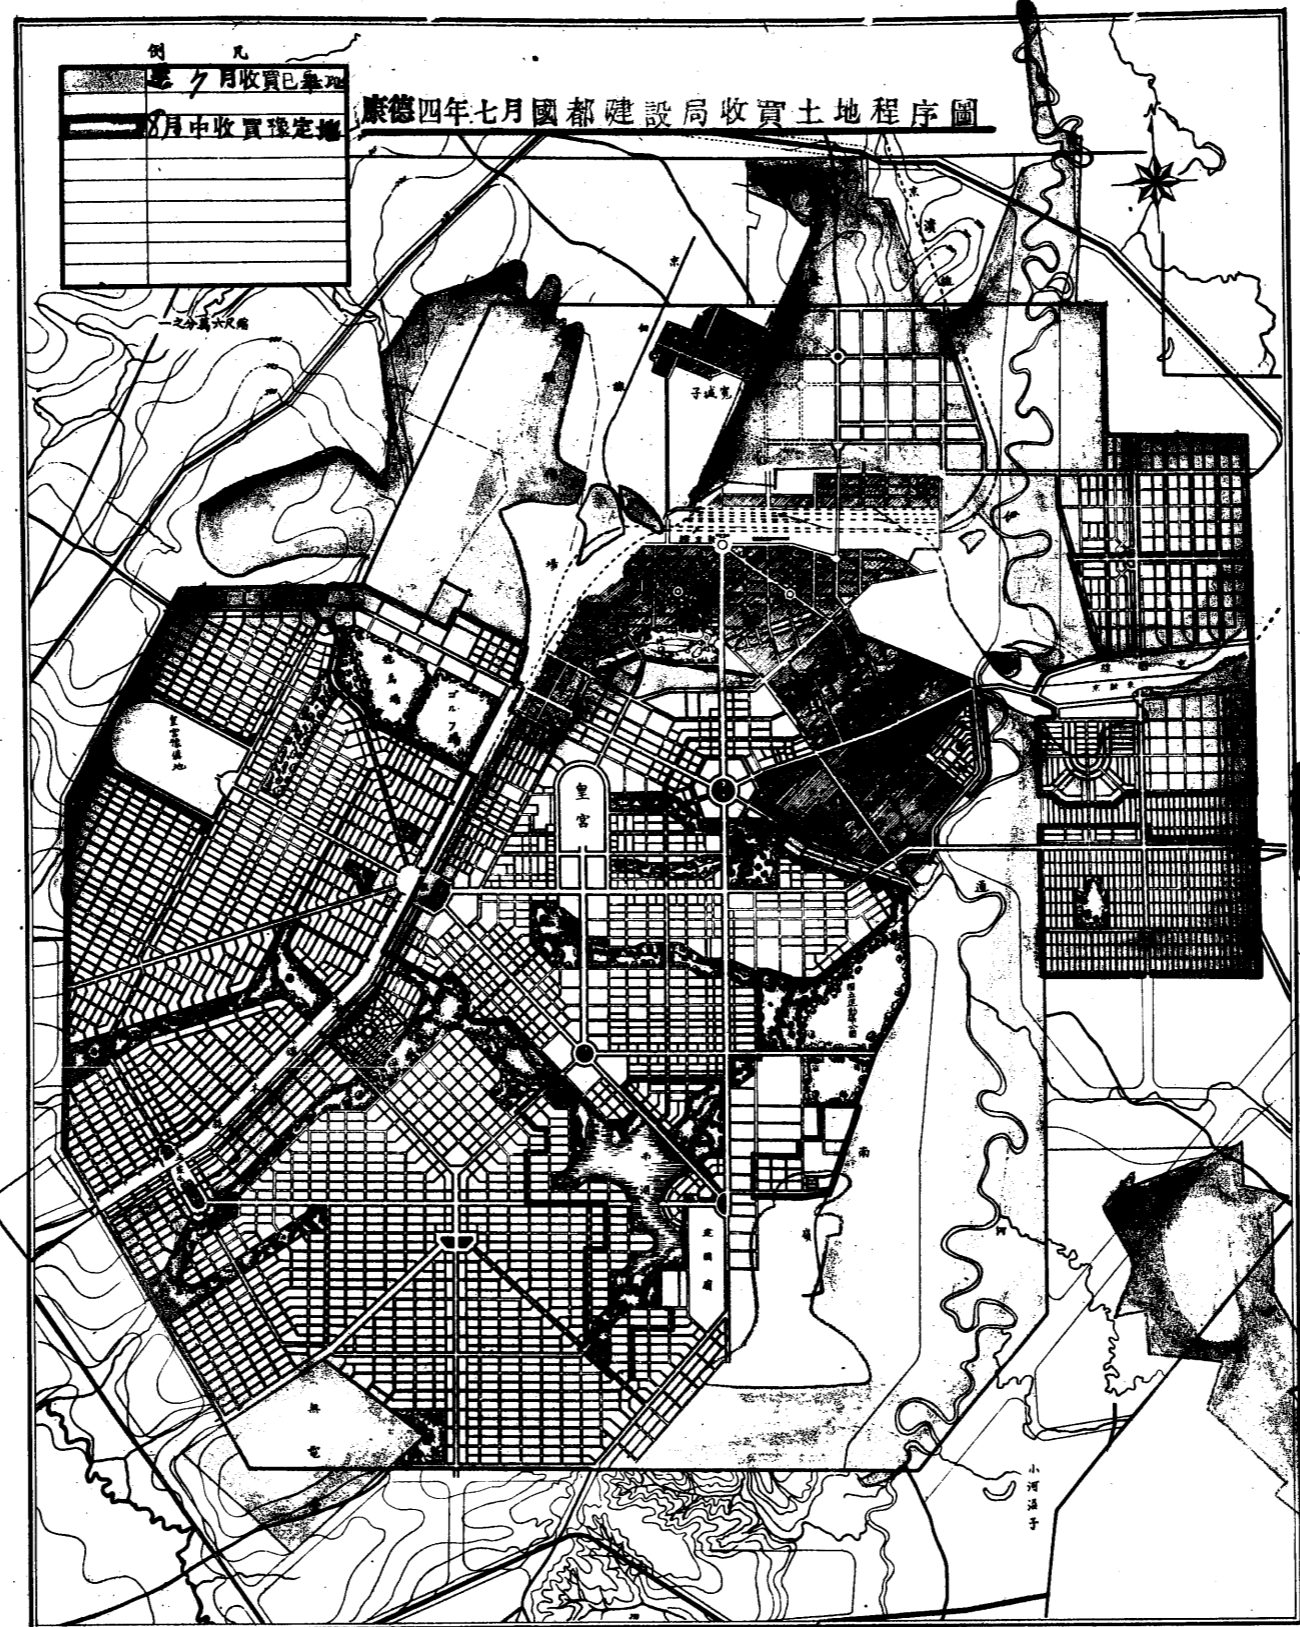

局設建都國院務國

REEL No. A-0670

0344

七月中ニ於ケル測量作業概況左ノ如シ


一、買收並開放地ノ測量作業

- (1) 南嶺公園墓地（事業區域南部）買收測量ニ着手、外業完了シ内業ハ來月中ニ完了ノ豫定ナリ
- (2) 孟家屯無電用地境界測設及南嶺軍用地境界及現地ノ案内ヲ行ヘリ
- (3) 各方面賣却地測量ハ建國大學用地ヲ完了シ、南新京、經濟部東部興仁大路方面ヲ續行中ナリ
- (4) 安民廣場附近、經濟部東部方面ノ地籍圖作成及地積ノ計算ヲ行ヘリ
- (5) 一萬分之一地形圖ノ作成及買收、測量進程圖ノ着色ヲ行ヘリ

二、計畫路線中心並區劃測量

- (1) 歡喜嶺公園墓地ノ區劃測量ノ完了
- (2) 孟家屯無電台敷地ノ區劃測量ノ完結
- (3) 車站東盛大街附近ノ中心測量一部ノ完了

- (4) 經濟部東方地域ノ區劃測量ハ一部ヲ殘シ完了
- (5) 鐵道北三不管方面ノ計畫路線中心測量續行中
- (6) 安民大路附近ノ區劃並中心測量續行中
- (7) 至聖大路以南ノ區劃並中心測量續行中

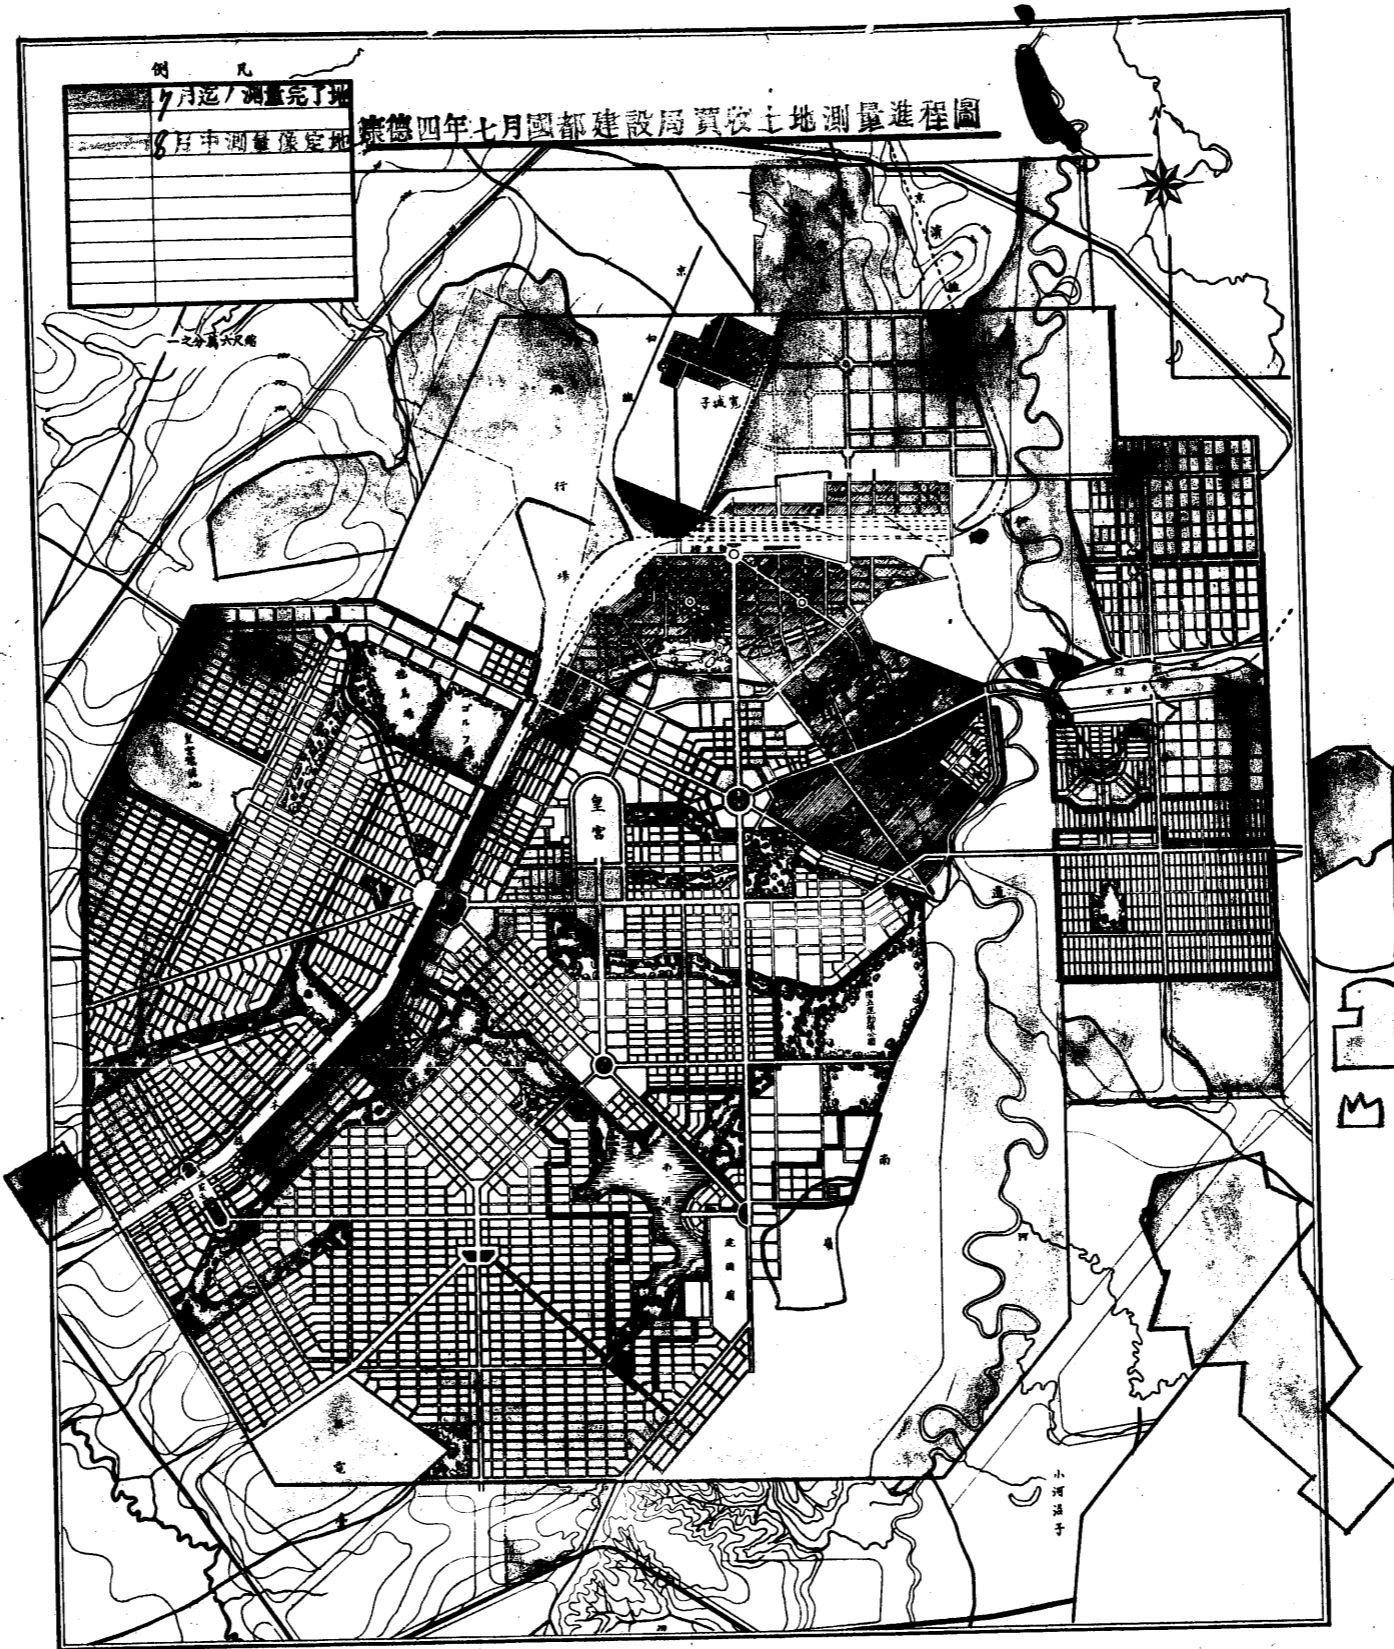

局設建都國院務國

REEL No. A-0670

0346

第十一章 製圖關係

各種調査、計算、測量等ニ基キ七月中ニ製圖セル主ナルモノ左ノ如シ

- (1) 新京都市計畫圖(五千分ノ一)ノ作成
- (2) 新天地街系統詳細圖ノ再度訂正ヲ行ヘリ
- (3) 地形圖索引圖ノ作成
- (4) 興仁大路以南街路系統圖道割及地番ノ變更
- (5) 軍政部發行ノ新京附近(五万分ノ一)地形圖ニ專業計畫線及環狀線ノ記入
- (6) 東站附近ノ地形圖貼合セ(義大精粉工場)

第十二章 道路關係

七月中ニ於ケル道路關係實施事項左ノ如シ

一、道路道形並鋪裝工事(暗渠築造工事ヲ含ム)

- (1) 安民大路以南(萬寶街、開運街間)道路道形築造及宅地造成工事
右ハ施工面積一二八、九四九坪、工費一五、七〇八圓、竣工豫定
德四年七月三十一日、岡組請負ニテ康徳三年十一月二十四日着工セ
ルモノナルカ結水期間中工事一時中止中ナリシ處四月二十五日再着
手、豫定通り七月三十一日竣工ヲ見タリ

(2) 長春大街外二街路面鋪裝(並雨水榭築造)工事

右ハ施工面積二五、六六七坪、道路工費三九、五八三圓、竣工豫定
康徳四年八月十五日、阿川組請負ニテ四月十四日着工セルモノナル
カ設計變更ニ伴ヒ工費四一、〇〇五圓ト更正シ銳意施工中ナルカ七
月末出來高九五%ナリ

(3) 同治街外二街路面鋪裝(並雨水榭築造)工事

右ハ施工面積一六、七七〇坪、道路工費三一、九八三圓、竣工豫定

康徳四年八月十五日西松組請負ニテ四月十七日着工セルモノナルカ
工程良ク進捗シ期限前七月三十一日竣工ヲ見タリ

(4) 興亞街外一街車道碎石鋪裝工事

右ハ施工面積九、四五三坪、工費二二、五二五圓、竣工康徳四
年七月三十一日森本組請負ニテ四月十九日着工セルモノナルカ康徳
通リ七月三十一日竣工セリ

(5) 東盛大街小鋪石鋪裝工事

右ハ施工面積一六、三一四坪、工費四八、九〇四圓、竣工康徳
四年六月三十日、草場組請負ニテ四月二十六日着工セルモノナルカ
施工區域ニ湧水箇所多キ爲メ側溝ヲ擴大スルト共ニ第一第二排水路
ヲ増築シ交叉點ニ混凝土管ヲ布設スル様設計變更ヲ行ヒタル結果工
期ヲ七月十日ニ延期シタルカ工程良ク進捗シ七月七日竣工ヲ見タリ

(6) 吉林大路(全安橋東盛大街間)小鋪石鋪裝(及下水)工事

右ハ施工面積六一、九五九坪、道路鋪裝工費一〇七、八三七圓、竣
工康徳四年八月三十一日、福昌公司請負ニテ五月五日着工セル

41

モノナルカ七月末出來高六五〇ナリ

(7) 和平大街道路道形暗渠築造及小鋪石鋪裝(並雨水樹築造)工事

右ハ施工面積七四、六九〇坪道路工費八五、一一〇圓、竣工康
徳四年七月三十一日、岡組請負ニテ五月五日着工セルカ原設計中一
部ヲ變更シタルニ伴ヒ工費八九、三一三圓、工期康徳四年八月十五
日ト更正シ銳意施工ヲ急キツツアルカ七月末出來高九〇〇ナリ

(8) 興仁大路外四街路面鋪裝(並雨水樹築造)工事

右ハ施工面積九九、七五六坪、鋪裝工費一五七、九八八圓、竣工康
徳四年八月十五日、日本鋪道會社請負ニテ五月八日着工セルモ
ノナルカ七月末出來高九〇〇ナリ

(9) 新發路附近路面鋪裝(並下水)工事

右ハ施工面積一五、五八三坪、鋪裝工費三五、二一〇圓竣工康
徳四年八月十日、尙厚温組請負ニテ五月十一日着工セルモノナルカ
七月末出來高九〇〇ナリ

42

(10) 平陽街外四街路面鋪裝(並雨水樹築造)工事

右ハ施工面積一一、三〇五料、鋪裝工費一四、三二五圓、竣工豫定
康徳四年八月十五日、昭和組請負ニテ五月十三日着工セルモノナル
カ設計變更ニ伴ヒ工費一四、一三三圓、工期七月十五日ト更正、豫
定通り七月十五日竣工ヲ見タリ

(11) 興仁大路（順天大街、南新京驛廣場間）路面鋪裝（並雨水樹築造）
工事

右ハ施工面積五六、六一七料、鋪裝工費一四六、〇七三圓、竣工豫
定康徳四年十月十五日、日本鋪道會社請負ニテ五月二十五日着工セ
ルモノナルカ七月末出來高四〇%ナリ

(12) 至聖大路以南乾明路間道路道形及宅地造成工事

右ハ施工面積一〇〇、四三〇料、工費一四、七五四圓、竣工豫定康
徳四年八月三十一日、坂本組請負ニテ五月二十五日着工セルモノナ
ルカ七月末出來高九五%ナリ

(13) 大同大街延長建國大學附近道形築造工事

右ハ施工面積二二、八〇〇料、工費一、九七九圓、竣工豫定康徳四

48

年八月五日、日滿土木請負ニテ五月二十八日着工セルカ設計變更ニ
伴ヒ工費マ二、四〇三圓ト更正シ銳意施工ヲ急キツツアルカ七月末
出來高九〇%ナリ

(14) 大同大街一部路面鋪裝（並雨水樹築造）工事

右ハ施工面積二八、五四四料、工費三八、二一〇圓、竣工豫定康徳
四年八月十五日、市瀨工務所請負ニテ五月二十八日着工セルモノナ
ルカ七月末出來高九五%ナリ

(15) 西順治路外一街路面鋪裝工事

右ハ施工面積七、一九五料、工費一三、五四七圓、竣工豫定康徳四
年八月二十日、萩澤組請負ニテ六月二日着工セルモノナルカ七月末
出來高九〇%ナリ

(16) 和順郷吉林大路北側附近道路道形築造及宅地造成並排水路築造工
事

右ハ施工面積八七、六八二料、工費六、四二八圓、竣工豫定康徳四
年八月三十一日、澁谷工務所請負ニテ六月七日着工セルモノナルカ

44

七月末出來高六五%ナリ

(17) 安民廣場外一街路面鋪裝（並雨水榭築造）工事

右ハ施工面積三八、九一九坪、工費一〇一、九九一圓、竣工豫定康
德四年八月二十日福昌公司請負ニテ六月八日着工セルモノナルカ七
月末出來高九〇%ナリ

(18) 盛京大路（和平大街、建國廣場間）道路道形暗渠築造及宅地造成
並木橋架設工事

右ハ施工面積二二三、三六六坪、工費九五、一七七圓、竣工豫定康
德四年十月三十一日坂本組請負ニテ六月九日着工セルモノナルカ七
月末出來高三〇%ナリ

(19) 盛京大路（和平大街、孟家屯間）道路道形暗渠築造、小鋪石鋪裝
及宅地造成（並雨水榭築造）工事

右ハ施工面積二二四、〇〇九坪、道路工費一一八、三〇四圓、竣工
豫定康德四年十月十日、岡組請負ニテ六月十一日着工セルモノナル
カ七月末出來高二五%ナリ

45

(20) 伊通國道西側排水路築造及假木橋架設工事

右ハ工費一六、〇〇八圓、竣工豫定康德四年八月二十五日、大信洋
行請負ニテ六月十二日着工セルモノナルカ七月末出來高六五%ナリ

(21) 東盛大街一部小鋪石鋪裝追加工事

右ハ施工面積三、五三四坪、工費二、八八〇圓、竣工豫定康德四年
七月三十一日、草場組請負ニテ七月七日着工セルモノナルカ豫定通
リ七月三十一日竣工セリ

(22) 大同大街鑛業開發會社前歩道鋪裝委託工事

右ハ工費四〇七圓、竣工豫定七月二十六日、萩澤組請負ニテ七月七
日着工セルカ豫定通り七月二十六日竣工セリ

(23) 大同大街至聖大路交叉點交通整理施設工事

右ハ施工面積八、四八四坪、工費二七、三九六圓、竣工豫定康德四
年八月三十一日、日本鋪道請負ニテ七月七日着工セルカ七月末出來
高七〇%ナリ

(24) 洪熙街附近道路道形暗渠築造並宅地造成工事

46

右ハ施工面積五二、九一六坪、工費九、六一五圓、竣工像定康徳四年九月十五日、弘隆組請負ニテ七月十日着工セルモノナルカ七月末出來高二〇%ナリ

(25) 協和會館入口道路改築工事

右ハ施工面積一八〇坪、工費八七九圓、竣工像定七月二十八日、菊池組請負ニテ七月二十四日着工、像定通り七月二十八日竣工セリ

(26) 西萬壽大街電々總裁邸歩道鋪裝委託工事

右ハ工費一二五圓、竣工像定八月二日、萩澤組請負ニテ七月二十四日着工、期限前七月二十七日竣工ヲ見タリ

(27) 東朝陽路外一街路面鋪裝工事

右ハ施工面積八、四五〇坪、工費一八、七五二圓、竣工像定康徳四年八月三十一日、西松組請負ニテ七月三十一日着工、目下施工準備中ナリ

47
二、補修工事

(1) 康徳四年度道路修繕工事

右ハ工費七六、〇五圓、竣工像定康徳四年十二月三十一日、萩澤組請負ニテ五月一日着工、引續キ施工中ノ處工事種別増加ノ爲メ工費ヲ八五、四七〇圓ト更正セルモノナルカ銳意施工ヲ行ヒツツアリ

三、雜工事

(1) 街路側溝築造用礫石製作工事

右ハ工費九〇八圓、竣工像定七月三十一日、福井高梨組請負ニテ五月二十七日着工セルモノナルカ工程良ク進捗シ期限前七月二十七日竣工ヲ見タリ

(2) 大同廣場興安大路々面清掃工事


右ハ工費三、三七五圓、竣工像定康徳四年十二月三十一日、自衛會請負ニテ七月一日着手以來引續キ道路ノ清掃ヲ行ヒツツアリ

(3) 康徳四年度後期道路清掃其他工事

右ハ工費二八、一二九圓、竣工像定康徳四年十二月三十一日、直營

- ヲ以テ七月一日着手以來引續キ道路ノ清掃ヲ行ヒツツアリ
- (4) 康徳四年度後期街路測量工事
右ハ工費一、五四三圓、竣工期日康徳四年十二月三十一日、直營ヲ以テ七月一日着手以來引續キ施工中ナリ
- (5) 七月中ノ道路占用及道路掘鑿許可件數ハ二十九件ナリ

四、輕便鐵道
全線保線ヲナセリ

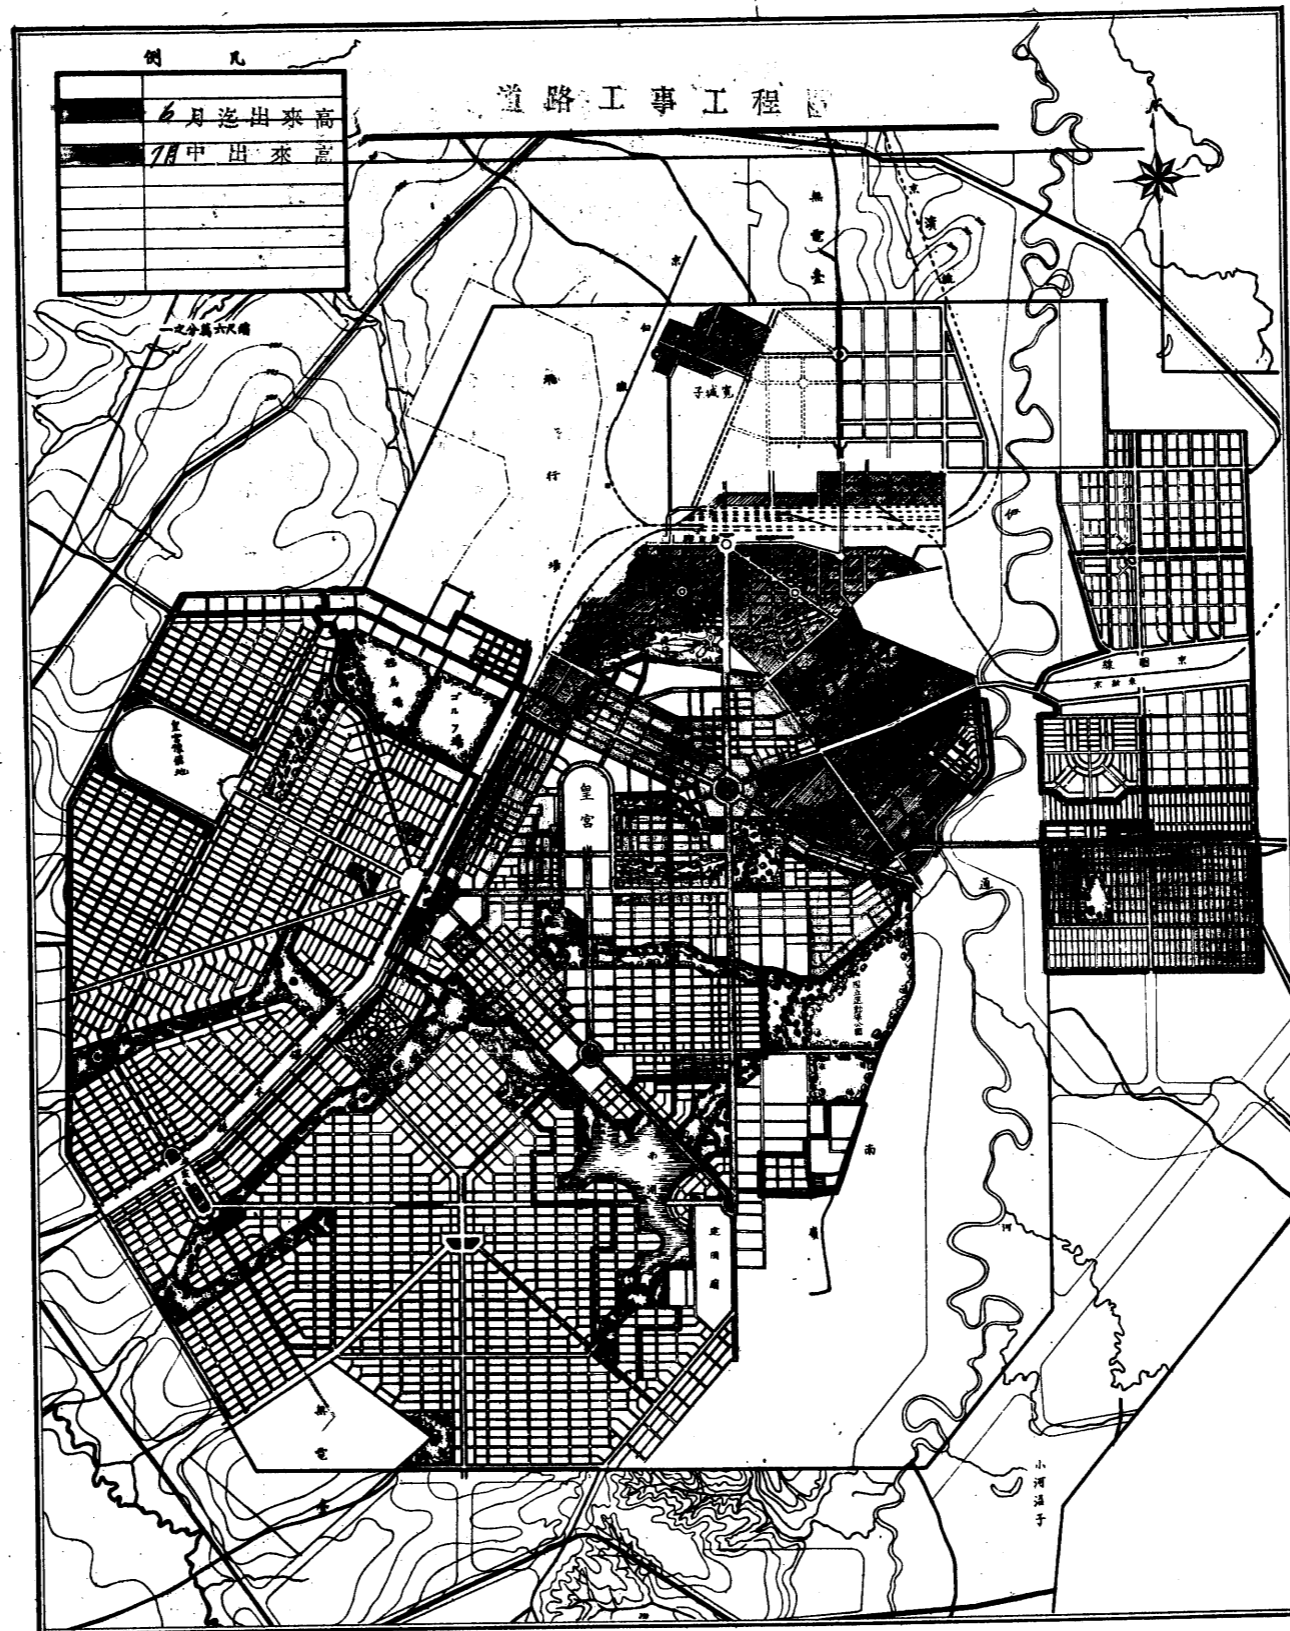

局設建都院務國

REEL No. A-0670

0353

第十三章 上水道關係

康徳四年七月中ノ上水道關係實施事項ノ主ナルモノ左ノ如シ
一、淨月潭貯水池關係工事

- (1) 淨月潭貯水池附近道路築造工事
右ハ工費三、四四九圓、竣工豫定康徳四年七月十五日、柳谷組請負ニテ三月十八日着工セルモノナルカ設計變更ニ伴ヒ工費四、〇二六圓ト更正シ豫定通り七月十五日竣工セリ
- (2) 淨月潭貯水池附近測量調査工事
右ハ工費三一四圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工以來引續キ施工中ナルカ七月末出來高六〇%ナリ
- (3) 淨月潭貯水池構作物維持補修工事
右ハ工費一、九三八圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ
- (4) 淨月潭堰堤附近樹木保護養生工事
右ハ工費一、七一〇圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ

50

- (5) 淨月潭堰堤溢水路改築工事
以テ四月十五日着工セルカ七月末出來高六〇%ナリ
- (6) 淨月潭堰堤溢水路改築工事
右ハ工費三四、六九九圓、竣工豫定康徳四年七月十五日、柳谷組請負ニテ五月五日着工セルモノナルカ設計變更ニ依リ工費三五、三三六圓、工期康徳四年九月二十日ト更正シタルカ七月末出來高六〇%ナリ

- (6) 淨月潭、南嶺淨水場間電線其他補修工事
右ハ工費一、二九六圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ六月十四日着工セルモノナルカ七月末出來高五〇%ヲ示セリ
- (7) 淨月潭配電線、南嶺淨水場連絡工事
右ハ工費一、七一八圓、竣工豫定康徳四年七月七日、滿洲電氣請負ニテ六月二十八日着工セルモノナルカ豫定通り七月七日竣工セリ

51

- (8) 淨月潭堰堤排水壕築造工事
右ハ工費一、九九九圓、竣工豫定康徳四年八月十五日、柳谷組請

負ニテ七月十日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ヲ示セリ

三 南嶺淨水場關係工事

(1) 第二回南嶺淨水場維持補修工事

右ハ工費三、七〇〇圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工セルカ七月末出來高六〇%ナリ

(2) 南嶺淨水場沈渣池増築其他工事

右ハ工費六三、四七一圓、竣工豫定康徳四年十月十五日、長谷川工務所請負ニテ七月十五日着工セルモノナルカ七月末出來高十五%ナリ

四 鐵管布設並其他工事費

(1) 第二回各水源井其他附屬補修工事

右ハ工費一、八〇二圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ

以テ四月一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ

(2) 第二回湧水試験工事

右ハ工費二五六圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ

(3) 第二回鐵管布設検査工事

右ハ工費一、八三三圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ

(4) 第二回送水管補修工事

右ハ工費三、六四四圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ

(5) 第二回配水管補修工事

右ハ工費六、八一七圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ四月一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ

(6) 第二回送配水管布設區域測量工事

右ハ工費四二一圓、竣工豫定康徳四年十月三十一日、直營ヲ以テ

- 四月一日着工セルモノナルカ七月末出来高六〇%ナリ
- (7) 瑞春街東光胡同附近鐵管布設工事
右ハ工費一一、八六六圓、竣工豫定康徳四年七月十五日、長谷川工務所請負ニテ六月十七日着工セルカ設計變更ニ伴ヒ工費八、四五七圓、工期七月十日ト更正シ豫定期日通り七月十日竣工セリ
- (8) 興仁大路一部鐵管掘下工事
右ハ工費八、四七九圓、竣工豫定康徳四年九月二十五日、日本鐵道會社請負ニテ六月二十三日着工セルモノナルカ七月末出来高五〇%ナリ
- (9) 養和屯第二深井戸唧筒掘替工事
右ハ工費一五六圓、竣工豫定康徳四年七月十日、直營ヲ以テ七月一日着工セルモノナルカ豫定通り七月十日竣工セリ
- (10) 軍政部會議所南一部鐵管布設工事
右ハ工費二、〇三七圓、竣工豫定康徳四年七月十日、長谷川工務所請負ニテ七月五日着工セルモノナルカ豫定通り七月五日竣工セリ

- (11) 永吉胡同通化胡同附近鐵管布設工事
右ハ工費一四、一〇三圓、竣工豫定康徳四年七月二十日、草場組請負ニテ七月六日着工セルモノナルカ豫定通り七月二十日竣工セリ
- (12) 永吉街吉林南胡同附近鐵管布設工事
右ハ工費一三、〇〇二圓、竣工豫定康徳四年七月二十日、神谷工務所請負ニテ七月六日着工セルモノナルカ豫定通り七月二十日竣工セリ
- (13) 長慶街至聖胡同附近鐵管布設工事
右ハ工費一〇、三〇六圓、竣工豫定康徳四年七月三十日、大信洋行請負ニテ七月九日着工セルモノナルカ豫定通り七月三十日竣工セリ
- (14) 百瀨街至聖胡同附近鐵管布設工事
右ハ工費八、六六二圓、竣工豫定康徳四年八月十日、鈴木組請負ニテ七月十四日着工セルモノナルカ七月末出来高九〇%ナリ
- (15) 各戸給水工事

七月中着手三五件、竣工三二件

四 給水状態

七月中ノ平均使用水量左ノ如シ

計	雑用水	市公署地域	満鐵附屬地	区域別	
				六月	七月
一六九四五	二五一	二六八二	五三〇七	八七〇五 ^B	増減
一九四九二	三九八	二九三〇	六六八八	九四七六 ^B	
(+) 二五四七	(+) 一四七	(+) 二四八	(+) 一三八一	(+) 七七一 ^B	

第十四章 下水道關係

七月中ニ於ケル下水道關係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

(1) 洪熙街附近雨水管布設工事

右ハ工費四四、一〇八圓、竣工線定康德四年九月三十日、福井高梨組請負ニテ四月十七日着工セルカ設計變更ニ伴ヒ工費四五、三〇〇圓、工期九月三十日ト更正シタルモ工程良ク進捗シ七月三十日竣工セリ

(2) 萬寶街附近雨水管布設工事

右ハ工費二七、二七五圓、竣工線定康德四年八月三十一日、神谷工務所請負ニテ四月十九日着工セルモノナルカ原設計中四米道路一部廢止ヲヨリ設計變更シ工費二六、九七六圓ト更正セル處線定期日前七月十二日竣工ヲ見タリ

(3) 同治街外二街（路面鋪裝並）雨水柵築造工事

右ハ工費四四圓、竣工線定康德四年八月十五日、西松組請負ニテ四月十七日着工セルモノナルカ線定期日前七月三十一日竣工セリ

(4) 長春大街外二街（路面鋪裝並）雨水柵築造工事

右ハ工費一、一八〇圓、竣工像定康徳四年八月十五日阿川組請負ニテ
四月十四日着工セルカ設計變更ニ伴ヒ工費一、二一〇圓ト更正、七月
末出來高九五%ナリ

(5) 吉林大路全安橋、盛京大路間（小鋪石鋪裝及）下水工事

右ハ工費一五、〇三一圓、竣工像定康徳四年八月三十一日、福昌公司
請負ニテ五月五日着工セルモノナルカ七月末出來高六五%ナリ

(6) 和平大路（道路道形暗渠築造及小鋪石鋪裝並）雨水樹築造工事

右ハ工費六四八圓、竣工像定康徳四年七月三十一日、岡組請負ニテ五
月五日着工セルモノナルカ道路工事變更ニ伴ヒ雨水樹一ヶ處ノ増設ニ
ヨリ工費六五一圓、工期八月十五日ト更新セルカ七月末出來高九〇%
ナリ

(7) 平陽街外四街（路面鋪裝並）雨水樹築造工事

右ハ工費六五八圓、竣工像定康徳四年七月十五日、昭和組請負ニテ五
月十三日着工セルモノナルカ像定通り七月十五日竣工セリ

58 (8) 興仁大路外四街（路面鋪裝並）雨水樹築造工事

右ハ工費二、一五九圓、竣工像定康徳四年八月十五日、日本鋪道會社
請負ニテ五月八日着工セルモノナルカ七月末出來高九〇%ナリ

(9) 新發路附近（路面鋪裝並）下水工事

右ハ工費三、三三八圓、竣工像定康徳四年八月十日、尙厚温組請負ニ
テ五月十一日着工セルモノナルカ七月末出來高九〇%ナリ

(10) 興仁大路順天大街、南新京驛廣場間（路面鋪裝並）雨水樹築造工事

右ハ工費一、七二一圓、竣工像定康徳四年十月十五日、日本鋪道會社
請負ニテ五月二十五日着工セルモノナルカ七月末出來高四〇%ナリ

(11) 大同大街一部（路面鋪裝並）雨水樹築造工事

右ハ工費一、五六五圓、竣工像定康徳四年八月十五日、市瀬工務所請
負ニテ五月二十八日着工セルモノナルカ七月末出來高九五%ナリ

(12) 康徳四年度下水管製作工事

右ハ工費一一二、七〇六圓、竣工像定康徳四年十月三十日、原組請負
ニテ五月二十八日着工セルモノナルカ七月末出來高四〇%ナリ
59 安民廣場外一街（路面鋪裝並）雨水樹築造工事

右ハ工費六三六圓、竣工豫定康徳四年八月二十日、福昌公司請負ニテ
六月八日着工セルモノナルカ七月末出來高九〇%ナリ

(14) 吉林大路民康路附近下水工事

右ハ工費二二、三〇七圓、竣工豫定康徳四年八月三十一日、長谷川工
務所請負ニテ六月十一日着工セルモノナルカ七月末出來高六〇%ナリ

(15) 盛京大路、和平大街孟家屯間（道路道形、暗渠築造、小鋪石鋪裝及
宅地造成並）雨水枿築造工事

右ハ工費九八八圓、竣工豫定康徳四年十月十日、岡組請負ニテ六月十
一日着工セルモノナルカ七月末出來高二五%ナリ

(16) 同治街一部下水管延長工事

右ハ工費九、五〇七圓、竣工豫定康徳四年八月十日、坂本組請負ニテ
七月一日着工セルモノナルカ七月末出來高九〇%ナリ

(17) 興仁大路下水道一部改造工事

右ハ工費五、七三〇圓、竣工豫定康徳四年十月十五日、日本鋪道會社
請負ニテ康徳四年七月七日着工セルモノナルカ七月末出來高三〇%ナ
リ

(18) 五色街附近下水道改造工事

右ハ工費八七一圓、竣工豫定康徳四年八月三十一日、福井高梨組請負
ニテ七月二十九日着工セルモノナルカ七月末出來高一〇%ナリ

(19) 豐樂路一二七號地附近一部下水道改造工事

右ハ工費四三圓、竣工豫定康徳四年八月四日、秋澤組請負ニテ七月二
十六日着工セルモノナルカ七月末出來高九〇%ナリ

(20) 百龍胡同一部下水管撤去工事

右ハ工費一六五圓、竣工豫定康徳四年八月十日、後藤組請負ニテ七月
二十九日着工セルモノナルカ七月末出來高五%ナリ

(21) 新天地附近下水工事

右ハ工費三〇、九二四圓、竣工豫定康徳四年九月三十日、後藤組請負
ニテ七月十日着工セルモノナルカ七月末出來高二〇%ナリ

(22) 康徳四年度雨水枿増設工事

右ハ工費三、五二四圓、竣工豫定康徳四年八月三十一日、秋澤組請負
ニテ七月三十一日着工、目下施工準備中ナリ

(23) 七月中ノ下水各戸取付工事ハ十六件ナリ

(23) 七月中ノ下水各戸取付工事ハ十六件ナリ

(22) 康徳四年度雨水枿増設工事

右ハ工費三、五二四圓、竣工豫定康徳四年八月三十一日、秋澤組請負
ニテ七月三十一日着工、目下施工準備中ナリ

(21) 新天地附近下水工事

右ハ工費三〇、九二四圓、竣工豫定康徳四年九月三十日、後藤組請負
ニテ七月十日着工セルモノナルカ七月末出來高二〇%ナリ

(20) 百龍胡同一部下水管撤去工事


右ハ工費一六五圓、竣工豫定康徳四年八月十日、後藤組請負ニテ七月
二十九日着工セルモノナルカ七月末出來高五%ナリ

(18) 五色街附近下水道改造工事

右ハ工費八七一圓、竣工豫定康徳四年八月三十一日、福井高梨組請負
ニテ七月二十九日着工セルモノナルカ七月末出來高一〇%ナリ

(17) 興仁大路下水道一部改造工事

右ハ工費五、七三〇圓、竣工豫定康徳四年十月十五日、日本鋪道會社
請負ニテ康徳四年七月七日着工セルモノナルカ七月末出來高三〇%ナ
リ

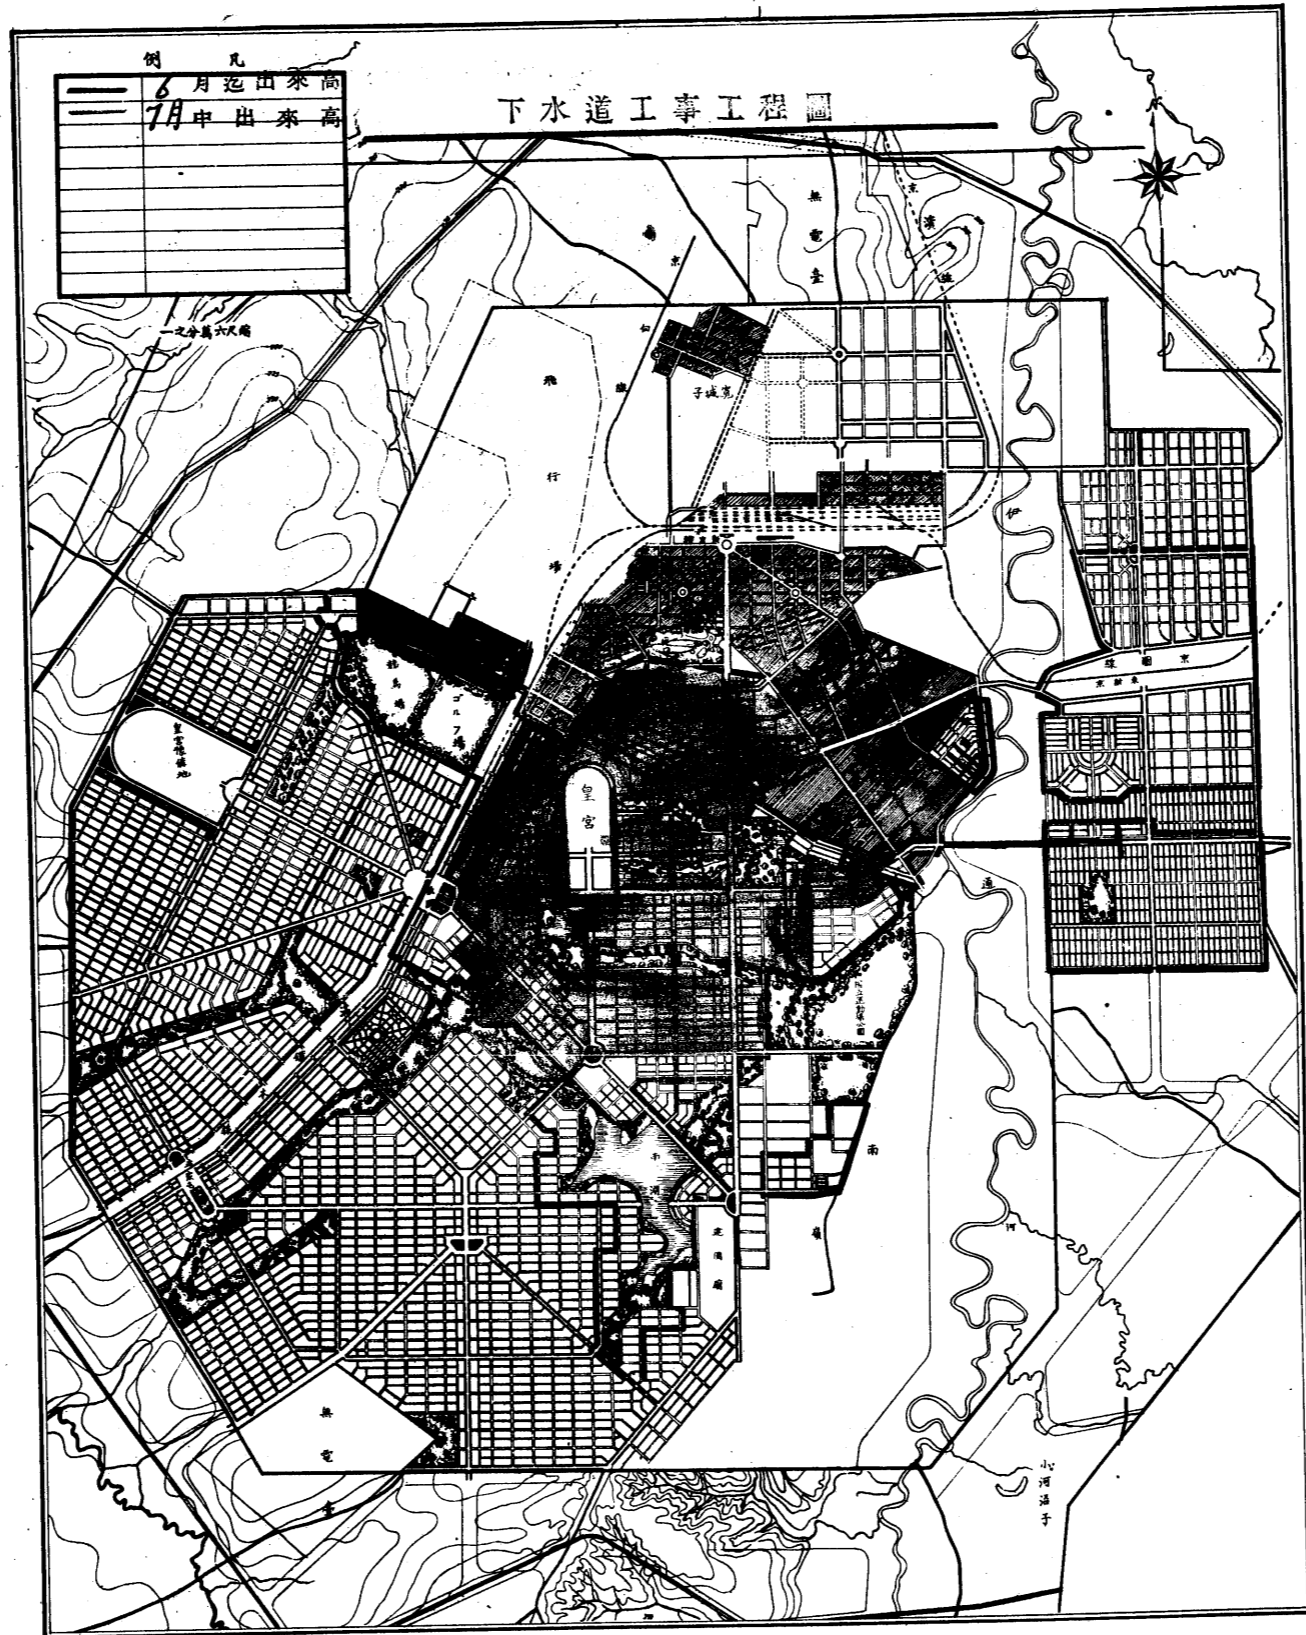

REEL No. A-0670

0360

アジア歴史資料センター

第十五章 建築關係

一、七月中ノ主ナル建築關係實施事項左ノ如シ

- (1) 建築申請書ノ審査、詳細ハ別紙ノ通り
- (2) 損失補償法ニヨル建物價格ノ鑑定（七月中七件）
- (3) 建設區域内建物台帳ノ整理
- (4) 建物整理カドノ作成
- (5) 建設區域内建築統計表ノ作成
- (6) 土木科詰所並車庫其他移轉改築工事ノ設計變更
右工事ハ設計變更ニヨリ請負額ヲ増額シ、竣工期限七月十五日ノ處七月三十日迄延長シタルモノナルカ像定通り七月三十日竣工セリ
- (7) 白山公園猿小屋増築並改造其他工事ノ設計變更
右ハ設計變更ニヨリ請負額ヲ増額シ、竣工期限七月十五日ノ處、七月三十日迄延長シタルモノナルカ像定通り七月三十日竣工セリ
- (8) 黄龍公園倉庫兼假詰所新築其他工事ノ設計變更
右ハ設計變更ニヨリ請負額ヲ増額シ、竣工期限七月十五日ノ處、七月三十日迄延長シタルモノナルカ像定通り七月三十日竣工セリ

第十五章 建築關係

一、七月中ノ主ナル建築關係實施事項左ノ如シ

- (1) 建築申請書ノ審査、詳細ハ別紙ノ通り
- (2) 損失補償法ニヨル建物價格ノ鑑定（七月中七件）
- (3) 建設區域内建物台帳ノ整理
- (4) 建物整理カドノ作成
- (5) 建設區域内建築統計表ノ作成
- (6) 土木科詰所並車庫其他移轉改築工事ノ設計變更
右工事ハ設計變更ニヨリ請負額ヲ増額シ、竣工期限七月十五日ノ處七月三十日迄延長シタルモノナルカ像定通り七月三十日竣工セリ
- (7) 白山公園猿小屋増築並改造其他工事ノ設計變更
右ハ設計變更ニヨリ請負額ヲ増額シ、竣工期限七月十五日ノ處、七月三十日迄延長シタルモノナルカ像定通り七月三十日竣工セリ
- (8) 黄龍公園倉庫兼假詰所新築其他工事ノ設計變更
右ハ設計變更ニヨリ請負額ヲ増額シ、竣工期限七月十五日ノ處、七月三十日迄延長シタルモノナルカ像定通り七月三十日竣工セリ

種別	取扱件数				未決件	處理百分比
	前月分未決	受理計	局處理却下計	未決件		
建築申請	三四	四二	三六	一	三九	四八六
竣工報告	六	一七	一二	一	一	五〇〇
土地利用計畫	二	一	二	二	一	六六六

建築出願件数表

康德四年七月分

- 一、商業地域ニ於テハ合計十五棟ニシテ一般店舗並住宅五棟、設計變更六棟、増築一棟、假建築一棟、吉林大路滿人店舗並住宅二棟ナリ
- 二、商館地域ニ於テハ東京海上火災保險株式會社新京ビル、鐵筋コンクリ造五層樓房一棟ナリ
- 三、南嶺ニ於テハ一般店舗並住宅ノ四棟ナリ
- 四、特別區域和順郷滿人住宅ノ既建築認可件数ハ一二八件ナリ

- 月二十五日迄延長シタルモノナルカ豫定通り七月二十五日竣工セリ
 - (9) 淨月潭貯水池從事員宿舍新築並其他工事
右ハ工費四、三八〇圓、坂本工務所請負ニテ七月十六日着工、九月三十日竣工ノ豫定ナリ
 - (10) 白山公園事務所附屬倉庫新築並其他工事
右ハ工費四五三圓、山田工務所請負ニテ七月二十四日着工シタルカ七月三十日豫定通り竣工セリ
 - (11) 記念碑建設工事ノ設計
 - (12) 計畫科黃龍公園浮亭新設試案ノ設計
 - (13) 順天公園門並柵其他新設工事ノ設計
- 二、建築出願審査概況
- 七月中ニ於ケル建築審査ノ結果認可ヲ與ヘタル建築物ハ左表ニ示ス如ク
- 一、住居地域ニ於テハ合計三十一棟ニシテ昭徳興業會社、滿鐵代用住宅九棟、一般住宅十九棟、假建築二棟、設計變更一棟ナリ

地域別建築物認可件数表

南橋	地域		商館		商業		地域		住居		計
	假建	本建	假建	本建	假建	本建	假建	本建	假建	本建	
		五			一	八	二	一七三	一七三	一七三	棟
		四四二二四			一一一九九	六四〇三八	一〇一八九	四二四六二	四二四六二	四二四六二	棟
						五、四一九三〇		二、七二七七八	二、七二七七八	二、七二七七八	棟
											棟
											棟
					五層		一				棟
					三六八九七四		五〇七一三				棟
		五			一	二四二五六六七〇	二	二九三九一五三四	二九三九一五三四	二九三九一五三四	棟
		四四二二四			一一一九九	一	一〇一八九				棟
											計

第十六章 公共施設関係

康徳四年七月中ニ於ケル公共施設関係事項ノ主ナルモノ左ノ如シ

一、公園

(1) 大同公園

(イ) 一般管理 近年稀有ノ旱天續キノ爲メカ綠蔭ニ涼ヲ求メ或ハ短

舟ニ乗ルモノ多ク市民ノ利用漸次増加セルカ本園ニテハ連日

巡視ヲ行ヒ以テ事故ヲ未然ニ防止セリ

(ロ) 維持作業 害虫驅除、芝刈込、除草、灌水、剪定、整枝、岩

波塘ノ護岸及一部浚深等ヲ實施セリ

(ハ) 特別使用 今月中ノ集會其他特別使用許可ハ四件、此ノ料金五

圓也

(2) 白山公園

變ニ横道河子産猛虎雌雄ヲ本園ニ飼養セシ以來頓ニ市民參觀者激

増セルモ、去月一頭病死シ本月初旬殘ル一頭モ相次テ病死セリ、

衛生技術廠及囑託獸醫ニヨル解剖ノ結果各レモ肝臓病ニシテ且馬肉ヨリ鼻疽ノ感染セル疑ヒアリト判明セルカ洵ニ痛惜ノ極ミナリトス、本園ニテハ早速消毒其ノ他ノ善後處置ヲ講シ一方「甲猛虎雄雄之靈」ナル記念碑ヲ建立セリ、其ノ他一般作業概況次ノ如シ

(イ) 一般管理 動物園、兒童園等入園者漸次増加シ本園ニテハ連日監視員ヲ巡邏セシメ事故ヲ防止スルニ努メタリ

(ロ) 維持作業 本園内動物舎ハ動物ノ増加ニ伴ヒ設備不完全ノ嫌アルヲ認メ、木造鐵線張二棟(四室)ノ増設及猿舎ノ改増築ヲ行ヒ越冬準備ヲ企圖シ併セテ木造倉庫兼番人詰所(一棟)ヲ新築シ以テ園内ノ整備ヲ圖レル外各動物舎ノ外柵ヲ改良セリ

(ハ) 其ノ他 花壇ノ管理、枯死木ノ處理、除草、灌水、芝生及ニレ垣ノ刈込、西部池畔苑路(巾四米延長五〇米)ノ新設ヲ行ヒタリ因ニ他公園ノ枯損木ヲ利用シ動物園内ニ涼亭一基ヲ築造セリ

(3) 牡丹公園

本園モ亦盛夏ト共ニ花苑觀賞者或ハ園内ヲ逍遙スルモノ多ク、一面花卉栽培、除草、灌水、剪定等作業ハ繁忙ヲ極メタリ

(イ) 一般管理 園内巡視ヲ連日續行セリ

(ロ) 温室管理 酷暑ノ爲メ入場者減少セルモ灌水、施肥、害虫驅除室外培養等ニ多忙ヲ極メタリ、因ニ今月中出賣高三圓九角ナリ

(ハ) 花苑管理 愈々開花季ニ入り温室同様作業多忙ヲ極メタリ、因ニ開花中ノ主ナルモノヲ譽ケレハ次ノ如シ

ダリヤ。カンナ。ダンヂヤ。ルビナス。サルビヤ。フロッタス。ドラモンデー等々

(ニ) 其ノ他 今月中特別使用ハ一件(使用料三圓也)庭球コート利用者ハ朝夕盛況ヲ呈シ居レルカ今月中令會員券五枚發行、此ノ金額三〇圓也ニ達セリ

(4)

順天公園

本園ハ本年度ヲ以テ大略完成ノ計畫ナリシトコロ地城廣大ノ爲メ大同大街以東ハ明年度ニ繰延施工ノ豫定ナリ、尙今月中實施セル造園並ニ管理概況次ノ如シ

(1) 苑路 花壇周圍、順天大街以西ノ苑路ノ輾壓及碎石、川砂散布約四八〇〇竪

(2) 整地 前全地城約五〇〇竪及承露池畔ノ地形修正約三二〇竪

(3) 除草 雜草繁茂著シキタメ芝生地、苑路其ノ他ノ除草約二五二〇〇竪

(4) 灌水 植栽樹木約九五〇本

(5) 刈込 園内ニ點在スル樺、柳ノ丸刈ニ五九〇本

(6) 花壇 噴水池ハ昨年度ヨリ繼續請負工事トシ施工中トコロ本月初旬竣成シコノ周邊ニ配置セル花壇ハ漸ク開花期ニ入り除

草、灌水等栽培(約一四四〇竪)手入ヲ行ヒタリ

(7) 兒童遊戯場 除草清掃其ノ他補修等約二〇〇竪

(5)

和順公園

(1) 藥草園 除草、灌水、其ノ他栽培約一、〇三〇竪ヲ施行ス尙本月

中結實セルモノ次ノ如シ

辛菜。罌粟。紅花。羊蹄。唐大黃等

開花中ノモノ

茴香。百合。西洋罌草。萱草。莫草。西洋骨接木。梓。

朝鮮鰐鱔。夏枯草。栝梗。泡成竹麻等々

旱天續キノタメ本園池水全ク涸渴シ水草類ハ殆ント枯死(若干他公園ニ移植)シ又魚類モ全滅シテ雜草繁茂夥シ、元來水源ハ伊通河ト連リ居タルモ年々此ノ地附近ニ出水被害アルタメ一時該水路ヲ築堤ニ依リ遮斷セラレタルニ因ル、因ニ今月中實施セル作業次ノ如シ

(1) 浚渫 涸渴セル池底ノ砂ヲ掘上ケ四米苑路約三七〇米ニ敷込ミ

(2) 除草 花壇附近約四〇〇〇竪

(6)

黃龍公園

其ノ他 澆水、植樹及枯枝ノ刈込、剪定、園内灌漑及其ノ他
一般管理ヲ實施ス

本年度ハ造園計畫ノ一般並ニ基本苑路ノ設定ヲ主トナスモノナ
ルカ今月中實施作業ハ次ノ如シ

(1) 苑路 南湖西岸ニ巾八米、延長三〇〇米ノ苑路ヲ造成シ附近

濕凹地ヲ約五十糎平均堀取り盛土セリ、其ノ他南湖周邊ニ
巾四米延長三二〇米及巾三米、延長約八〇米ノ苑路ヲ築造

セリ

(2) 整地 西岸約三六〇糎、南岸約三六〇糎ノ盛土ヲ行ヘリ

(3) 張芝 島ノ反對側斜面ニ野芝約六五〇糎ヲ張芝トセリ

(4) 南湖 湖水ハ旱天續キノタメ解氷當時ト大差ナキモ既ニ鴨、
雁、信天翁等數十羽飛來セリ尙作業用ニ「多」ボ「ト」船賃

龍號」ノ運航ヲ開始セリ

(5) 假詰所 倉庫等假詰所（木造一棟）ハ本月末竣工セリ

二、運動場外苑

本月ハ八月舉行ノ全滿體育大會ヲ目焦ノ間ニ控ヘ、各競技場補修ト
相俟チ外苑モ亦整美ノ必要ヲ認メ陸上トラツツ、足球場、籠球場、
排球場ノ外周苑路ノ補修約三二〇糎、今抽城ノ除草一五七三〇糎
及樹木ノ剪定一七七二本、澆水約三〇〇〇本ヲ實施セリ

三、種苗圃

(1) 第一種苗圃

除草及澆水ヲ苗床全糎ニ且リ實施シ、一部樹苗ノ剪定ヲ行ヘリ
器具修繕及其ノ他一般管理ヲ施行セリ

(2) 第二種苗圃

苗圃内樹木ノ澆水、剪定ヲ實施セルカ今春新植セルモノノミナ
爲メ且旱天續キニヨリ約三〇%枯死セリ尙其ノ他諸器具ノ修理並
一般管理ヲ施行セリ、

四、墓地葬祭場

(1) 南部（歡喜嶺）公園墓地

第二種苗圃ノ南側ニ假植中ナル墓地植栽樹木ハ移植季並ニ計畫區域未確定ナルタメ引續キ保護管理ヲ續行セリ、即チ除草、灌水、枝條剪定等ノ作業ヲ實施セリ

五、受託工事

(1) 街路樹

一、一般街路樹維持管理工事

(1) 大同廣場及興安大路綠地帯ノ外周「ニレ」其ノ他灌水並刈込

(2) 大同大街外三十四街路ノ除草、徒長芽除去、剪定並ニ枯損木ノ整理

(3) 昨秋及今春植栽樹ニ對シ灌水ヲ行ヒタリ

(4) 種苗圃内ニ假植中ノ街路樹ヲ保護管理セリ

二、順天大街植樹帶造園工事

(1) 整地並ニケンツツキ一芝種子一、二〇〇封塵ノ播種

(2) 楡樹ノ灌水

(3) 楡樹ノ枯死セルモノ八本ノ植替ハ

(2) 廣場

安民廣場造園工事

(1) 整地 三四〇〇坪、(2) 芝生 二一五〇坪造成、(3) 人止碑 廣場周邊ニ一、〇二〇本、(4) 除草 芝地及死蔭内約七三三〇坪、(5) 剪定 六〇〇本、(6) 灌水 六三〇〇坪

(3) 局外植栽受託工事

國都綠化促進ノ目的ニ據リ今春以降受託施行セル局外植栽次ノ如シ(七月末)

(1) 件數 司法部廳舎外五一件、(2) 金額九三三三・二〇圓

種苗運供給 九六九七本 三八六一・〇〇

其ノ他勞力材料 四六四二・〇六

朝掛 八五〇・一四

第十七章 工事件名表
 康徳四年七月申ニ着手セル工事件名 (着手、竣工共ニ本月中ノモ、竣工ノ部ヘ記載ス)

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工年月日	請負人
一三一	同治街一廊下水管延長工事	土木	九五〇六・五三 (設置)	四七七一	康徳(延期) 四八一〇	坂本組
一三二	新天地附近追加下水工事	土木	三〇九二四・三四	四七一〇	四九三〇	後藤組
一三三	大同廣場興安大路々面清掃工事	土木	三三七五・一二	四七一	四一二・三一	自強會
一三七	康徳四年度後期、道路清掃其他工事	土木	二八一二八・九五	四七一	四一二・三一	直營
一三〇	第二種苗圃維持管理其ノ二工事	計費	四九七・二〇	四七一	四九三〇	直營
一三一	第一種苗圃維持管理其ノ一工事	計費	八〇二・六〇	四七一	四九三〇	直營
一三二	康徳四年度後期計費街路測量工事	計費	一、五四三・一五	四七一	四一二・三一	直營

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工年月日	請負人
一三三	街路樹維持管理並附帶其ノ二工事	計費	三、二八〇・八〇	四七一	四九三〇	直營
一三四	南部公園墓地假植樹木管理並附帶工事	計費	二四三・三八	四七一	四九三〇	直營
一三五	興仁大路下水道一部改造工事	土木	五七三〇・一三	四七七	四一〇・一五	日本 彌道
一三六	大同大街、至聖大路交叉點交通整理施設工事	土木	二七三九六・一九	四七七	四八三一	日本 彌道
一三七	東盛大街一部小鋪石鋪裝追加工事	土木	二八八〇・四三	四七七	四一〇・一五	草場組
一三九	洪熙街附近道路消形暗渠築造並宅地造成工事	土木	九六一四・五四	四七一〇	四九一五	弘隆組
一四〇	南樹淨水場沈澱池増築其他工事	水道	六三、四七一・二一	四七二五	四一〇・一五	長谷川 工務所
一四一	淨月潭堰堤排水管築造工事	水道	一、九九九・七六	四七一〇	四八一五	柳谷組
一四三	百龍街、至聖胡同附近其他鐵管布設工事	水道	八六六一・五九	四七二四	四八一〇	鈴木組

一五五	國都建設區域内土地調査測量工事	計費	八三六七・五〇	四七一	四二二三一	直營
一五六	大同公園維持管理其三工事	計費	八〇〇・〇〇	四七一	四九三〇	直營
一五七	白山公園維持管理其三工事	計費	一、五二五、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一五八	牡丹公園維持管理其三工事	計費	七〇〇、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一六〇	百體胡同一部下水管撤去工事	土木	一六六、〇〇四	四七二九	四八一〇	後藤組
一六一	黃龍公園造園並管理其三工事	計費	六五四八、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一六二	康徳四年度雨水碑増設工事	土木	三、五二四、〇二	四七三一	四八三一	萩澤組
一六三	東朝陽路外一街路舗装工事	土木	一八七五、八二	四七三一	四八三一	西松組
一八二	康徳四年度後期中心測量工事	計費	二、四八〇、〇〇	四七一	四二二三一	直營
一八三	康徳四年度後期區劃測量工事	計費	三、四三〇、〇〇	四七一	四二二三一	直營

一四四	綜合運動場外苑造園並維持管理工事(其ノ三)	計費	六七〇、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一四五	順天公園造園並維持管理(其三)工事	計費	一、八二〇、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一四六	淨月潭貯水池從事員宿舍新築其他工事	水道	四八一五、〇〇	四七一六	四九三〇	坂本工務所
一四七	和順公園並維持管理(其ノ二)工事	計費	八八、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一四九	安民廣場造園並維持管理(其ノ二)工事	計費	一、五〇〇、〇〇	四七一	四九三〇	直營
一五一	五色街附近下水道改造工事	土木	八七一、三一	四七二九	四八三一	福井高梨組
一五二	黃龍公園内土塚堤呑口側護岸工事	計費	六五八、六〇	四七二四	四八三〇	坂本組
一五三	豐樂路一二七號地附近一部下水改造工事	土木	四二、一〇	四七二六	四八四	萩澤組

武 七月中竣功セル工事件名左ノ如シ

工番	工事件名	起案 科名	金額	着手 年月日	竣功 年月日	請負人
康三年 四〇〇	安民大路以南萬寶街跡街道 形築造及宅地造成工事	土木	一五七〇七・六一 圓	康德 三一、二四	康德 四七三一	岡組
康四年 二二	淨月潭貯水池附近道路築造工 事	水道	四〇二五・九九 (設變)	四 三一八	四 七一五	柳谷組
三二	洪照街附近雨水管敷設工事	土木	四五二九九・六五 (設變)	四 四一七	四 七三〇	福井 高梨組
三三	萬寶街附近雨水管敷設工事	土木	二六九七五・五三 (設變)	四 四一九	四 七三〇	神谷 工務所
三四	同治街外二街跡面鋪裝並雨 水溝築造工事	土木	三三〇七七・一三 (設變)	四 四一八	四 七三一	西松組
三五	興亞街外一街車道碎石鋪裝 工事	土木	二二、五二四・九八 (設變)	四 四一九	四 七三一	森本組
五四	東盛大街小鋪石鋪裝工事	土木	四八、九〇四・二五 (設變)	四 四二六	四 七七一	草場組

工番	工事件名	起案 科名	金額	着手 年月日	竣功 年月日	請負人
康四年 六七	平陽街外四街跡面鋪裝並雨 水溝築造工事	土木	一四七九〇・七一 (設變)	康德 四五一三	康德 四七一五	昭和組
八四	街路側溝築造用緣石製作工 事	土木	九〇七・八〇 (設變)	四 五二七	四 七二七	福井 高梨組
九三	安民廣場造園工事	計費	二、九一三・〇〇	四 五一五	四 七一〇	直營
九六	土木科詰所並車庫其他移轉 改築工事	建築	三、一三二・五〇 (設變)	四 六七	四 七三〇	森本組
一〇八	舊公園倉庫兼假詰所新築 其他工事	建築	二、四〇二・二八 (設變)	四 六一一	四 七二五	椿組
一九	白山公園積小屋増築並改造 其他工事	建築	二、九五七・六〇 (設變)	四 六一四	四 七三〇	山田 工務所
二七	淨月潭貯水池附近鐵管布 設工事	水道	八、四五七・二九 (設變)	四 六一七	四 七二〇	長谷川 工務所
二八	淨月潭配電線、南嶺淨水場 連絡工事	水道	一、七二七・五八	四 六二八	四 七七七	瀨谷 電氣
一三三	義和屯二號深井戸唧筒据替 工事	水道	一五五・六〇	四 七一	四 七一〇	直營

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工年月日	請負人
三三	第二回各水源其他附屬補修工事	水道	一、八〇一・七五	四四一	四四一	直營
三四	第二回湧水試験工事	水道	二五六・二〇	四四一	四四一	直營
三五	第二回鐵管檢查工事	水道	一、八三二・六六	四四一	四四一	直營
二八	第二回送水管補修工事	水道	三、六四三・五六	四四一	四四一	直營
二九	第二回配水管補修工事	水道	六八一六・九二	四四一	四四一	直營
三〇	第二回送配水管布設區域測量工事	水道	四二〇・五〇	四四一	四四一	直營
三六	長春大街外二街路面翻裝並雨水柵築造工事	土木	(設變) 四二、二一四・八二	四四一	(延期) 四八三	阿川組
四〇	第二回南嶺淨水場維持補修工事	水道	三、七〇〇・〇〇	四四一	四四一	直營

三、七月中引續キ施行中ノ工事件名

工番	工事件名	起案科名	金額	着手年月日	竣工年月日	請負人
一四八	西萬壽大街電々總敷出前鋪裝委託工事	土木	一二四・八一	四七二	四七二	秋澤組
一五〇	協和會館入口道路改裝工事	土木	八一九・九九	四七二	四七二	菊地組
一五四	白山公園事務所附屬倉庫新築其他工事	建築	四五三・〇〇	四七二	四七三	山田事務所
一五九	國都建設局構内自動車庫並詰所災害復舊工事	建築	三二五・〇〇	四七七	四七七一	工務本
一四二	長慶街至聖胡同附近鐵管布設工事	水道	一〇、三〇六・〇九	四七九	四七三〇	洋大信
一三八	大同大街鐵業開發會社前歩道鋪裝委託工事	土木	四〇七・一九	四七七	四七二六	森澤組
一二九	水吉街、吉林胡同附近鐵管布設工事	水道	一三、〇〇一・七八	四七六	四七三〇	神谷事務所
一二八	水吉胡同通化胡同附近鐵管布設工事	水道	一四、一〇三・〇九	四七六	四七二〇	草場組
一二五	淨月潭貯水池構内木柵築造其他工事	水道	(設變) 一一、四三・二六	四七八	四七二一	柳谷組
一三四	軍政部會議所第一節鐵管布設工事	水道	二〇、三七・三八	四七五	四七二〇	長谷川事務所

九九	九五	九二	八九	八八	八七	八三	七〇	六八	康四年
安民廣場外一街路面鋪裝並雨水溝築造工事	康德四年度下水管製作工事	大同大街延長神國大學附近道路道形築造工事	大同廣場植栽移植其ノ他工事	大同大街一部路面鋪裝並雨水溝築造工事	興仁大路(順天大街、兩新京驛廣場間)路面鋪裝雨水溝築造工事	至聖大路以南彰明路間道路道形築造及宅地造成工事	新發路附近路面鋪裝及下水工事	興仁大路外四街路面鋪裝並雨水溝築造工事	興仁大路外四街路面鋪裝並雨水溝築造工事
土木	土木	土木	計費	土木	土木	土木	土木	土木	土木
一〇二、六二七・七〇	一一二、七〇六・二〇	(設變) 二、四〇二・八一	二、四二八・九一	三九七七・七四	一四七、七九二・八六	一四七、五四、四八	三八、五四七・八七	一六〇、一四五・九五	一六〇、一四五・九五
四、六、八	四、五、二、八	四、五、二、八	四、五、二、三	四、五、二、八	四、五、二、五	四、五、二、五	四、五、一、一	四、五、八	康德
四、八、三、一	四、一〇、三、〇	(延期) 四、八、五	四、八、三、一	(延期) 四、八、三、一	四、一〇、一、五	四、八、三、一	四、八、一、〇	四、八、一、五	康德
公福昌	原組	日滿土木	直營	市瀨工務所	日滿	坂本組	尙厚温	日滿	日滿

六三	六二	六一	五六	五五	五二	四八	四七	康四年
淨月潭堰堤溢水路改築工事	康德四年度第三回下水道維持修繕工事	康德四年度道路修繕工事	和平大街道路形暗渠築造及小舖石鋪裝並雨水溝築造工事	吉林大路(全安橋、東盛大街間)小舖石鋪裝及下水工事	淨月潭堰堤附近樹木保護養生工事	淨月潭貯水池構作物維持補修工事	淨月潭附近測量調査工事	淨月潭附近測量調査工事
水道	土木	土木	土木	土木	水道	水道	水道	水道
三五、三四六・四九	九〇、一七・三一	(設變) 八、五四七〇・九三	(設變) 八、九九六四・二三	一、三、八、六六・八七	一、七、一〇・一二	一、九、三八・一八	三、一、三、五六	三、一、三、五六
四、五、五	四、五、五	四、五、一	四、五、五	四、五、五	四、四、一、五	四、四、一	四、四、一	康德
四、九、二、〇	四、一、二、三一	四、一、二、三一	(延期) 四、八、一、五	四、八、三、一	四、一〇、三、一	四、一〇、三、一	四、一〇、三、一	康德
柳谷組	後藤組	秋澤組	岡組	公福昌	直營	直營	直營	直營

一六九	一一九	一一五	一一四	一一二
街路植樹帶芝播種並附帶 工事	興仁大路一部管線掘下工 事	淨月潭淨水場開電線其他 補修工事	順天大街植樹帶造園工事	西順治路外一街鋪裝工事
計費	水道	水道	計費	土木
四九一七・一六	八四七九・四四	一、二九六・〇〇	四〇七五・八六	一三五四七・二〇
四六二五	四六二三	四六一四	四五五	四六二二
四九三〇 (延期)	四九二五	四一〇三一	四一〇三一	四八二〇
直營	日本 鋪道	直營	直營	秋澤組

一一一	一〇六	一〇五	一〇四	一〇三	一〇二	一〇〇
伊通國道西側排水路築造及 假木橋架設工事	和順鄉吉林大路北側附近道 路造形築造及宅地造成並排 水路築造工事	盛京大路(和平大街、建國 廣場間)道路造形暗渠築造 及宅地造成並木橋架設工事	開元胡同和光路附近鐵管布 設工事	開元明善路附近鐵管布設工 事	盛京大路(和平大街、孟家 屯間)道路造形暗渠築造及 宅地造成小鋪石、鋪裝並雨 水樹築造工事	吉林大路民康大路附近下水 工事
土木	土木	土木	水道	水道	土木	土木
一六〇〇八・二四	六四二八・三五	九五一七七・五六	一六八九三・八一	一五八七七・六八	一一九二九一・五一	二、三〇六・九五
四六二二	四六七	四六九	四六七	四六七	四六一一	四六五
四八一五	四八三一	四一〇三一	四八二五 (延期)	四八二五 (延期)	四一〇一〇	四八三一
洋大 行信	工務所 盛谷	坂本組	和藤 工務所	和藤 工務所	岡組	長谷川 工務所

協和會國都建設局分會事項

(山) 滿洲親善慶祝大會開催ニ關スル件
七月十三日附協和會首都本部長ヨリ首魁ノ件ニ關シ官民合同祝
宴會列席方懇懇アリタリ依ツテ當分會ニ於テハ當日七月二十日
會長以下幹事多數出席セリ
因ニ祝賀會次第ハ次ノ如シ

一、名稱 滿洲親善慶祝大會

一、主催 滿洲帝國協和會

一、後援 關東軍、滿洲國政府、滿鐵、弘報協會、市公署

一、時日 七月二十日(火曜日) 午後六時午

一、場所 西公園陸上競技場

一、順序

(1) 官民合同祝賀宴(會費壹圓)

(一) 一同着席

(二) 開會之辭

(三) 日滿滿三國旗ニ敬禮

(四) 三國歌吹奏

(五) 祝詞

(六) 決議

(七) 謝辭

(八) 開宴

(九) 三國萬歲三唱

(十) 閉會之辭

(11) 記念講演(右祝宴ニ引續キ同所ニテ)

駐滿獨逸通商代表クノール博士、大橋外務局長官、松岡滿鐵總裁
ニ於テ各地巡回講演ス

(12) 映畫會(右講演ニ引續キ同所ニテ)

獨逸紹介映畫並ニ滿洲紹介映畫

(13) 新京聯合防空演習参加ノ件

七月廿一日ヨリ三日間ニ亘ル新京聯合防空演習ニ當局ハ特殊防護

閣トシテ参加セルカ二十三日大同大街ニ於テ舉行セラレタル分列式ニ参加シ無事解散セリ
以上

3

普通第二六六三號

昭和十五年九月二十八日

在上海

日本總領

外務省情報部 御中



別册別便

分類 A6.10.17

興建運動關係「パンフレット」送付ノ件
興建運動關係「パンフレット」若干別便ヲ以テ送付スルニ付平野義太郎氏（總町區内幸町幸「ビル」太平洋協會氣付）宛轉交方可然御取計相煩度シ

在上海日本總領事館

分類	A	原簿	附音
項目	6	ハ	
日	6		
號	1-1-6		

(分類 A.1.1.7)

昭和16 九二八九 略

メルボルン 四月八日後發
本 省 八日後着

河相公使

近衛外務大臣
第二號

聯邦首府ヲ「カンベラ」ニ置クコトニ多分ノ無理アリ其ノ結果聯邦
制(機構ハ甚タ變態ヲ免カレス)即チ(一)各大臣ハ議會開會中ハ概ネ
火、水、木ヲ「カンベラ」ニ殘餘ハ四百哩ヲ距ツル「メルボルン」
「シドニー」ニ過シ議會閉會中ハ「カンベラ」ニ居住セス「メルボ
ルン」ニ過スモノ多シ茲ニ政治主動力ノ季節的地理的集散アリ閣議
モ必スシモ「カンベラ」ニ於テ行ハレス(二)書記官長次官以下ノ常駐
スル各省其ノ他ノ所在地左ノ通り
「カンベラ」
内閣、外務、大藏、商務、關稅、内務、外領
「メルボルン」

外務省

(日本標準規格B5)

國防統一省、戰時内閣、宣傳、遞信、軍需、陸軍、海軍、空軍、勞
働、其ノ他小麥、羊毛、船舶等ノ「ボード」等
「シドニー」
船舶ノ「ボード」等(了)

外務省

(日本標準規格B5)

REEL No. A-0670

外機密

件名	タイ
項目	還都
日付	4-27

本機A6007

一四六四七 暗 昭和十七年四月二十一後七時五十分 南二
在「タイ」 石井代理大使 東郷外務大臣

「タイ」還都ニ關スル件
第五〇四號

十八日盤谷發同盟電ニ依レハ今回「タイ」國政府ハ首都ヲ「ピサ
ンローク」ニ還スコトニ内定シ還都準備調査ヲ開始セル趣ナル處
本件真相御取調ノ上至急御回電アリタシ

外務省

(日本標準規格B5)

外機密

昭和17 一六二〇 (暗) 盤谷 四月二十四日後發 南
本省 二十五日後着

東郷外務大臣

石井代理大使

第七五一號

(「タイ」國ノ還都說ニ關スル「ワンワイ」ノ談話内容)

貴電第五〇四號ニ關シ

「ワンワイ」ノ談話ニ依レハ盤谷ハ「タイ」國ノ中央ニ所在セサ
ルニ付遷都說ハ從來モ時折問題トナリタルコトアルカ今回ハ開戦
後爆撃ノ結果首都ト商業都市ヲ同一地域形ナスコト及大學其ノ他
ヲ休校セサルヘカラサル等ノコトモアリテ北方中央部適當ノ所ニ
首都ヲ移スコトヲ「ゴン」首相ニ於テ發議シ最近新内務大臣「ブ
ローム」ヲシテ二、三候補地ノ現地調査ヲ行ハシメタルニ依リ噂
ニ上リタル次第ナルモ實際問題トシテ自分ノ計算ニテハ一億「バ
ーツ」ヲ要シ急速ニハ實現ノ可能性ナキモノト思料セラルトノコ
トナリ(了)

外務省

(日本標準規格B5)

REEL No. A-0670

昭和17 一四一〇三 暗 盤谷 五月二十一日後發
本省 二十二日後着 南
東郷外務大臣 石井代理大使
第九七三號

(「タイ」國ノ遷都説ニ關スル「ワンワイ」ノ談話内容)
往電第七五一號ニ關シ
「ブルーイン」ノ内山ニ語ル所ニ依レハ「タイ」政府ニ於テハ主
都ヲ「ストラブリー」ニ移スコトニ内定セルカ之カ實現ニハ六年乃
至十年ヲ要スヘク目下盤谷市工務部ニ於テ都市計畫立案中ニシテ
同地ハ盤谷ノ北方約百五十「キロ」ニ位シ「メナム」河ノ上流「ハ
ーサツク」河ニ面シ陸路鐵道舟運共ニ便且地域廣濶、用水亦豊富
ナリトノコトナリ尙同地ニ接セル「ロブリー」ニハ曩ニ軍隊移駐
ノ爲相當ノ兵舎及「ホテル」等ノ設備ヲモ有スル由(了)

(日本標準規格B5)

外務省

昭和17 一七五四〇 略 盤谷 六月二十五日後發
二十六日前着
東郷外務大臣 坪上大使
第一二九〇號

(「タイ」國ノ遷都ニ關スル件)
往電第九七三號ニ關シ
二十四日宣傳局長ハ「タイ」字記者トノ會見ニ於テ遷都問題ニ關
シ左ノ如ク發表セリ
本問題ハ既ニ確定シ遷都準備モ著々實施中ニシテ政府ハ各省ニ對
シ盤谷ニ於ケル各種建築營繕ノ停止ヲ命シタリ尙遷都ノ理由トシ
テ
一 盤谷ハ軍事上ノ據點ニ非ス殊ニ防備上ニ缺點アリ
二 盤谷ハ土地低ク水準線ト同高ニシテ排水カ不十分ナル爲衛生上
不適當ナリ

(日本標準規格B5)

外務省

編者	原
附	編
頁	原
目	編
項	編
額	編
門	編
ニ	編
ア	編
ラ	編
リ	編

A 6007

昭和17 一七七四七 平 盤谷 六月二十七日後發
 本省 二十八日前着
 年上大使
 東海外務大臣
 第一三三〇號
 (タイ)國ノ邊都ニ關スル件)
 往電第一二九〇號ニ關シ
 政府ハ首都指定地「サラブリ」地方ニ對スル土地收買勅令ヲ二十二
 日勅官報ヲ以テ公布セリ(了)

外務省

(日本標準規格B5)

三 盤谷ハ首都トシテ建設シタルモノニアラサル爲工場住宅地帯混
 雜シ美觀上不便ニシテ之ヲ地帯別ニ整理スルハ容易ナラス且巨
 額ノ費用ヲ要スヘシ
 四 盤谷ハ商業都市トシテ適當ナリ
 五 新都ハ佛教都市トス「サラブリ」所在ノ佛蹟ハ以テ「タイ」國
 佛教ノ中心都市タルニ適當ス
 (了)

外務省

(日本標準規格B5)
